

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES - SUPARC**

**RELATÓRIO GERAL DE VERIFICAÇÃO**  
**SAECULARIS\_C07\_M01\_A24**

|                                  |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato:</b>                 | Contrato de Parceria Público-Privada<br>Nº 007/2020                                                                                                                                 |
| <b>Mês de Avaliação</b>          | Janeiro de 2024                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto:</b>                   | Prestação de serviços como Verificador Independente, atuando na fiscalização, aferição do desempenho e avaliação dos impactos socioeconômicos e na qualidade dos serviços prestados |
| <b>Miniusinas:</b>               | Miniusina VII – GD                                                                                                                                                                  |
| <b>Poder Concedente:</b>         | SEAD                                                                                                                                                                                |
| <b>Empresa Concessionária:</b>   | RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS<br>SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA                                                                                                                       |
| <b>Verificador Independente:</b> | Saecularis                                                                                                                                                                          |

**Fevereiro de 2024**

## Sumário

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>RESUMO</b>                                                       | <b>3</b> |
| 1. INTRODUÇÃO                                                       | 5        |
| 2. PANORAMA CONTRATUAL                                              | 6        |
| 3. FUNÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE                              | 7        |
| 3.1. Atribuições do Verificador Independente                        | 8        |
| 3.2. Estrutura Organizacional                                       | 10       |
| 4. DADOS TÉCNICOS DO CONTRATO                                       | 11       |
| 5. CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA PPP (R\$/kWh)                       | 13       |
| 6. VISITA TÉCNICA                                                   | 17       |
| 7. LISTA DE RATEIO DAS UNIDADES BENEFICIADAS                        | 18       |
| 8. GERAÇÃO DE ENERGIA                                               | 21       |
| 8.1. DADOS DE GERAÇÃO DOS INVERSORES                                | 22       |
| 8.2. DADOS FORNECIDOS PELO SCADA                                    | 25       |
| 8.3. DADOS DE FATURAMENTO DA EQUATORIAL PIAUÍ                       | 27       |
| 9. FATURAMENTO CONTRATO 07/2020                                     | 26       |
| 9.1. AVALIAÇÃO DOS DADOS DE GERAÇÃO DA FATURA                       | 26       |
| 9.2. AVALIAÇÃO DO VALOR COBRADO                                     | 31       |
| 9.3. BASE HISTÓRICA DO CUSTO DO kWh DA PPP                          | 34       |
| 10. INDICADORES DE DESEMPENHO                                       | 39       |
| 10.1. INDICADORES DE OBRA                                           | 40       |
| 10.1.1. Índice de Execução de Obra                                  | 40       |
| 10.1.2. Custo de Obra                                               | 41       |
| 10.2. INDICADORES DE OPERAÇÃO                                       | 42       |
| 10.2.1. Desempenho de Produção de Energia                           | 42       |
| 10.2.1. Eficiência da Usina Fotovoltaica                            | 44       |
| 10.2.1. Rendimento dos Inversores                                   | 45       |
| 10.3. INDICADORES DE MANUTENÇÃO                                     | 46       |
| 10.3.1. Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos           | 46       |
| 10.3.2. Número de limpeza parcial e geral dos módulos fotovoltaicos | 47       |
| 10.3.3. Número de atividades preventivas realizadas                 | 48       |
| 10.3.4. Número de atividades preditivas realizadas                  | 49       |
| 10.3.5. Número de atividades corretivas realizadas                  | 49       |
| 10.4. INDICADORES EDUCACIONAIS                                      | 50       |
| 10.5. INDICADORES ECONÔMICOS                                        | 50       |
| 11. PLATAFORMA DE GESTÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE                | 50       |

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 12. | CONTROLE DE PENDÊNCIAS.....     | 54 |
| 13. | SOLICITAÇÕES E COMUNICAÇÃO..... | 56 |
|     | REFERÊNCIAS.....                | 58 |
|     | CONCLUSÃO .....                 | 59 |

## FIGURAS

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Localização da usina.....                                                 | 13 |
| Figura 2 - Macrolocalização da usina .....                                           | 13 |
| Figura 3 - Área de trabalho da plataforma SCADA utilizada pela Rio Poti Energia..... | 21 |
| Figura 4 - Fatura de energia do mês de janeiro de 2024 .....                         | 29 |
| Figura 5 - Quadro de dados da fatura de energia .....                                | 29 |
| Figura 6 - Documentos protocolados pela SPE .....                                    | 27 |
| Figura 7 - Tarifas aplicadas Grupo A3 (sem imposto) .....                            | 36 |
| Figura 8 - Tarifas aplicadas Grupo B (sem imposto) .....                             | 37 |
| Figura 10 - Software de monitoramento e gestão de contrato.....                      | 53 |

## TABELAS

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Estrutura organizacional do Verificador Independente.....    | 10 |
| Tabela 2 - Dados gerais do contrato .....                               | 12 |
| Tabela 3 - Relatório fotográfico .....                                  | 15 |
| Tabela 4 - Lista de rateio das unidades consumidoras da SEAD.....       | 18 |
| Tabela 5 - Tabela de geração de energia dos inversores .....            | 23 |
| Tabela 6 - Base de dados fornecidos pelo SCADA .....                    | 25 |
| Tabela 7 - Tabela de faturamento da SPE .....                           | 28 |
| Tabela 8 - Base de dados de geração.....                                | 29 |
| Tabela 9 - Base dados do Banco de Crédito.....                          | 30 |
| Tabela 10 - Avaliação do Índice de Execução de Obra .....               | 41 |
| Tabela 11 - Resumo do faturamento .....                                 | 43 |
| Tabela 12 - Rendimento dos inversores apurados em janeiro de 2024. .... | 46 |
| Tabela 14 - Estrutura do software de gestão de contrato .....           | 51 |
| Tabela 15 - Cronograma de desenvolvimento do software .....             | 54 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 16 - Quadro de pendências contratuais dos agentes envolvidos ..... | 54 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tabela 17 - Controle de comunicação e solicitações ..... | 56 |
|----------------------------------------------------------|----|

## GRÁFICOS

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 1 - Comparativo de custo de energia para o grupo B3 .....                                 | 16 |
| Gráfico 2 - Geração de energia no mês de Janeiro .....                                            | 24 |
| Gráfico 3 - Geração de energia no mês de Janeiro .....                                            | 26 |
| Gráfico 4 - Histórico de geração mensal de 2023 .....                                             | 29 |
| Gráfico 5 - Base de dados do Banco de Crédito .....                                               | 31 |
| Gráfico 6 - Custo do kWh do projeto de PPP .....                                                  | 35 |
| Gráfico 7 - Comparativo do custo do kWh entre o projeto de PPP e o Grupo A (sem imposto)<br>..... | 36 |
| Gráfico 8 - Comparativo dos custos de energia do ACR GRUPO B3 e da PPP .....                      | 37 |
| Gráfico 9 - Comparativo do valor do reajuste anual. ....                                          | 38 |

## RESUMO

O presente relatório mensal de verificação independente elaborado pela SAECULARIS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, tem como objetivo avaliar as etapas de construção, operação e manutenção do contrato de PPP 007/2020. Durante a análise do mês de **janeiro de 2024** não foram encontradas inconformidades que afetem o processo de geração e desempenho do projeto.

Para o relatório do mês de janeiro foram analisados os seguintes itens:

- Dados de geração dos inversores, por meio de planilhas dos inversores;
- Dados de geração fornecidos pela aplicação SCADA;
- Documentação de Faturamento;
- Indicadores de Desempenho;
- Relação do custo do kWh.
- Visita técnica.

Em análise feita aos dados e arquivos enviados pela SPE, foi constatado um valor de geração de 617.252,40 kWh que está abaixo do valor de 650.000 kWh conforme estipulado no EVTEA do projeto, porém a SPE detém um saldo positivo no banco de crédito suficiente para complementar o valor da energia a ser faturada.

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP, o faturamento apresentado pela SPE referente ao mês de janeiro de 2024 é apresentado o valor de contraprestação total de R\$ 484.858,53 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), os detalhes do reajuste anual está presente no item 9.2 deste relatório.

O valor cobrado pela SPE é referente a contraprestação máxima mensal de 2023, que é de R\$ 484.858,52 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Considerando que a SPE cumpriu com suas atividades no mês de janeiro, o valor cobrado está em conformidade.

O item 9.3 referente a base histórica dos custo do kWh, apresenta novas informações quanto aos reajustes tarifários da ANEEL, em que foi possível constatar uma vantajosidade significativa para o projeto, visto que o reajuste da contraprestação representou um aumento de

aproximadamente 5% do valor, enquanto que a RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIO N 3.292 DA ANEEL trouxe um aumento da tarifa de energia no valor médio de 14,70%.

## 1. INTRODUÇÃO

A Transição Energética é um processo global de transformação do sistema energético, com o objetivo de promover uma mudança para fontes de energia mais limpas, sustentáveis e renováveis. Esse processo busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e carvão, que são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e contribuem para as mudanças climáticas. A Transição Energética é considerada um passo fundamental para mitigar os impactos ambientais e sociais da produção e consumo de energia, garantir a sustentabilidade e criar um futuro mais resiliente.

O contexto atual das mudanças climáticas é alarmante e exige ações urgentes para mitigar seus impactos. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis, tem levado a um aquecimento global acelerado, causando mudanças climáticas significativas em todo o mundo. Essas mudanças têm efeitos profundos nos ecossistemas, na economia, na saúde humana e na qualidade de vida das pessoas.

O poder público desempenha um papel fundamental no processo de transição energética, que busca a substituição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por fontes renováveis e sustentáveis. A transição energética é uma estratégia global para enfrentar os desafios relacionados à mudança climática, à segurança energética e à sustentabilidade ambiental. A importância do poder público na transição energética acontece em diversas áreas, com destaque para as 3 a seguir:

1. **Formulação de políticas públicas:** O poder público é responsável por criar e implementar políticas públicas que promovam o uso de fontes de energia renovável, estabelecendo metas e diretrizes para a transição energética. Isso inclui a criação de incentivos fiscais, subsídios, regulamentações e normas que favoreçam a geração, distribuição e uso de energia renovável.

2. **Estímulo ao desenvolvimento econômico e social:** A transição energética pode trazer oportunidades de desenvolvimento econômico e social, como a criação de empregos na indústria de energia renovável, o fortalecimento de cadeias produtivas locais, a redução de custos com energia e a melhoria da qualidade de vida da população. O poder público pode atuar no estímulo a essas oportunidades, buscando a inclusão social e a distribuição dos benefícios gerados pela transição energética.

**3. Promoção do uso de energias renováveis nos próprios órgãos públicos:** O poder público pode dar o exemplo e promover o uso de energias renováveis em suas próprias instalações, como prédios públicos, escolas, hospitais e órgãos governamentais, através da implementação de projetos de geração de energia renovável em suas próprias propriedades.

O Governo do estado do Piauí reconhece o enorme potencial energético da região e tem como objetivo não apenas reduzir a despesa pública, mas também alinhar-se com as pautas de ESG (Environmental, Social and Governance) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Além disso, busca atuar como vetor de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.

Nesse contexto, o Governo do estado do Piauí propõe-se a ingressar no processo de transição energética, por meio da aquisição de mais de 5.000.000 kWh/mês de energia solar, por meio da implantação de 08 miniusinas fotovoltaicas, construídas em parceria com um parceiro privado selecionado para o projeto PPP Energias Limpas do Piauí.

## **2. PANORAMA CONTRATUAL**

A Saecularis Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA foi contratada pela empresa RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA para a Prestação de Serviços de Verificador Independente, conforme dispositivos constantes no Contrato de Parceria Público-Privada nº 07/2020, com total autonomia e independência, sem qualquer espécie de subordinação ao Contratante ou ao Poder Concedente.

A Saecularis atua no interesse do Poder Concedente - SEAD, como Verificador Independente para o desenvolvimento de estudos e análises técnicas, no apoio à fiscalização e acompanhamento da Concessão, sob responsabilidade da RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA.

O Prazo da Concessão é de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data de assinatura do Contrato, que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2020, tendo sua eficácia condicionada à operacionalização da garantia contratual.

O Contrato de Verificador Independente tem vigência de 5 (cinco) anos, prorrogável mediante aditivo após manifestação das partes, contados a partir da data da assinatura em 10 de janeiro de 2022.



O objeto do contrato de Concessão é a Implantação, Manutenção e Gestão de Mini-usinas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, com Gestão e Operação de Serviços de Compensação de Créditos de Energia Elétrica que visa suprir a demanda energética de parcela da estrutura física do Poder Executivo da Administração Pública Estadual.

Para o cumprimento do objeto caberá ao Concessionário identificar e adquirir os imóveis, previamente definidos conforme aspectos técnicos- que, ao final do prazo da PPP, deverão ser revertidos ao Poder Concedente.

### **3.FUNÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE**

O Verificador Independente tem o papel intrínseco de trazer lisura e independência quanto aos interesses das partes envolvidas no Contrato de Parceria Público-Privada.

Desta forma o papel do VERIFICADOR é realizar a avaliação de desempenho do concessionário de forma transparente, conferindo imparcialidade ao processo, ao mesmo tempo em que preserva o interesse público. Fica sob sua responsabilidade o cálculo mensal do montante de Contraprestação Pecuniária a ser repassada ao CONCESSIONÁRIO pelo PODER CONCEDENTE.

Além de atuar como elemento de apoio adicional para o poder público, a verificação independente gera mais valor para o Poder Concedente, contribuindo para uma gestão eficaz dos contratos e a boa comunicação entre as partes, reduzindo atritos e garantindo a efetividade do serviço prestado ao cidadão em uma concessão.

Com transparência e independência, o Verificador Independente monitora a qualidade do serviço prestado pelo Concessionário, medindo periodicamente os indicadores de desempenho previstos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC. Item 4.1.

Além da economia gerada pela garantia de eficiência da Verificação Independente dos serviços do Concessionário, a medição dos indicadores gera uma Nota de Desempenho que pode resultar ainda em redução nos reajustes tarifários repassados aos usuários.

É também seu papel promover o constante alinhamento entre as partes, assegurando a integração e o fluxo racional de comunicação, atuando de forma transparente e consistente na aferição do desempenho e realizando a gestão de pleitos por meio de suporte técnico em casos de divergência entre as partes.

Para evitar a assimetria de informações, durante todo o prazo do Contrato de Concessão Patrocinada (PPP), as partes envolvidas, sendo elas Poder Concedente (SEAD),

CMOG, Concessionária e Verificador Independente, devem ter como princípio básico que todos os projetos, correspondências, comunicados, atas de reuniões, pareceres, decisões e outras atinentes ao Contrato serão compartilhados com cópias para todas as partes.

Por fim, o Verificador Independente deve suportar tecnicamente eventuais ajustes nos pagamentos do Concessionário, sempre assegurando a remuneração justa, de acordo com o estabelecido em contrato.

### **3.1. Atribuições do Verificador Independente**

- Monitorar os resultados da execução da Concessão e validar os dados obtidos, além de proceder a pesquisas e levantamentos quando necessário, conforme definido no Contrato de PPP.
- Indicar ou sugerir o aumento ou diminuição da periodicidade de aferição, mudanças necessárias no processo de quantificação e apuração dos indicadores de desempenho ou quaisquer outras observações mais benéficas ao processo.
- Validar todos os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e extraordinária, e ajudar na avaliação de casos de questionamentos ou conflitos de entendimento sobre questões de ordem econômica e financeira dos contratos, conforme previsões contidas nos contratos de concessão.
- Analisar o cenário que originou a reivindicação frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico, o qual deverá dar suporte à análise econômico-financeiro, avaliando e dimensionando, caso exista, o impacto econômico-financeiro do pleito no projeto.
- Observar os parâmetros para a recomposição econômico-financeiro estabelecidos nos contratos de concessão, consolidando os resultados de suas análises em relatório técnico financeiro.
- Validar as especificações nos procedimentos de aquisição dos bens e no recebimento das obras, conforme estipulado no Contrato de PPP e seus anexos.
- Apresentar mensalmente relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, nos termos da Minuta do Contrato de Verificação, o qual conterá, sempre que couber, as seguintes informações: a) Confrontação, dos resultados apurados com aqueles produzidos pelas Concessionárias e apontamento de possíveis causas para as divergências; b) Fontes das informações e dados utilizados no relatório; c) Memórias de cálculos; d) Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a

fiscalização dos Contratos de PPP; e) Indicação de falhas porventura cometidas pelas Concessionárias; f) Nome e assinatura da equipe técnica responsável pela confecção do relatório;

- Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle, com a participação do Comitê de Monitoramento e da Concessionária, devendo ser registrado, em ata, as providências a serem adotadas no sentido de assegurar o cumprimento das exigências e prazos do Contrato de PPP.
- Deverá desenvolver sistema de tecnologia da informação para acompanhamento das informações geradas pela Concessionária, permitindo o acompanhamento e monitoramento dos indicadores de desempenho e das obrigações financeiras atreladas ao contrato de concessão, devendo analisar e validar a integridade dos dados apresentados pela Concessionária;
- Deverá apoiar o Poder Concedente na eventual revisão e justificativa de alteração dos indicadores de desempenho, caso seja necessário, recomendando indicadores mais adequados e seus respectivos níveis de serviços, de forma a assegurar o melhor uso dos recursos destinados à concessão;
- Deverá recomendar ao Poder Concedente os parâmetros para a recomposição econômico-financeira do Contrato de Concessão, consolidando os resultados de suas análises em relatórios específicos;
- Deverá se manifestar, previamente à decisão do Poder Concedente, acerca da validação dos dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e extraordinária de quaisquer obrigações contratuais, inclusive dos indicadores de desempenho e das atualizações dos serviços para a integração de inovações tecnológicas que sejam eventualmente exigidas para manter o serviço adequado;
- Deverá realizar reuniões mensais, em formato virtual, entre a sua equipe e a do Poder Concedente, podendo também contar com representantes da Concessionária, com o objetivo de otimizar o acompanhamento e a gestão contratual, tratar quaisquer temas que se mostrem relevantes para o bom andamento do Contrato de Concessão e endereçar desafios que se apresentem;
- Deverá realizar visitas in loco para a verificação das metas e investimentos realizados pela Concessionária e para o tratamento e acompanhamento de quaisquer intercorrências na gestão contratual que se insiram no âmbito das competências dos Verificadores Independentes.

### 3.2. Estrutura Organizacional

A atuação como Verificador Independente, conta com equipes específicas para cada tipo de serviço contratado. Essas equipes são constituídas por profissionais especializados em suas áreas de atuação, contando, quando necessário, com o suporte e apoio das empresas integrantes do Consórcio e de Consultores Especializados.

Segue abaixo a apresentação dos profissionais que fazem parte do quadro técnico.

*Tabela 1 - Estrutura organizacional do Verificador Independente*

| NOME                                    | FORMAÇÃO                | FUNÇÃO                              |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Jorge Ivan Teles de Sousa               | Contador                | Coordenador Geral                   |
| Felipe Oliveira Silva                   | Engenheiro Eletricista  | Coordenador Técnico                 |
| Francisco Wenio de Sousa<br>Soares      | Engenheiro Eletricista  | Consultor em Energia Solar          |
| Luna Arnaud Rosal Lopes                 | Economista              | Consultora Econômico-<br>Financeiro |
| Rodrigo Antônio Rodrigo<br>Feitosa Lima | Cientista da Computação | Consultor em Tecnologia             |
| Cláudia Martins Costa Teles             | Contadora               | Consultora em Gestão                |

#### 4. DADOS TÉCNICOS DO CONTRATO


Tabela 2 - Dados gerais do contrato

| Contrato de PPP Nº 07/2020 – Terreno Privado |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Poder Concedente</b>                      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD                         |
| <b>Concessionária</b>                        | RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA |
| <b>Prazo da Concessão</b>                    | 25 anos                                                    |
| <b>Valor da contraprestação</b>              | R\$ 387.500,00                                             |
| <b>Valor do Contrato</b>                     | R\$ 17.813.769,25                                          |
| <b>Localização da usina</b>                  | Campo Maior - PI                                           |
| <b>Coordenada de Acesso - UTM</b>            |                                                            |
| <b>Zone</b>                                  | 23 M                                                       |
| <b>Latitude UTM</b>                          | 810033.50 m E                                              |
| <b>Longitude UTM</b>                         | 9460891.15 m S                                             |

Figura 1 - Localização da usina



Figura 2 - Macrolocalização da usina

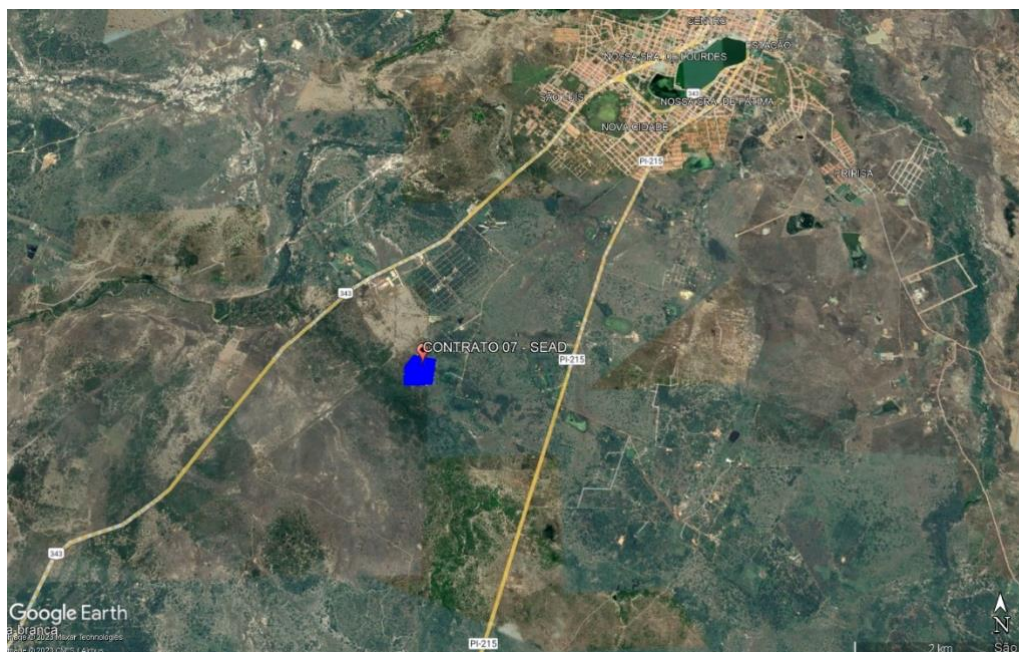

## 5. CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA PPP (R\$/kWh)

A unidade R\$/kWh é uma representação do custo da energia elétrica em reais por quilowatt-hora. É uma medida utilizada para expressar o valor em reais (R\$) que um consumidor paga por cada quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica consumida.



O quilowatt-hora (kWh) é uma unidade de medida de energia elétrica que representa a quantidade de energia consumida em uma hora por um dispositivo elétrico com potência de 1 quilowatt (1 kW). É uma unidade amplamente utilizada para medir o consumo de energia elétrica em residências, indústrias e comércios.

O valor em reais (R\$) por quilowatt-hora (kWh) pode variar de acordo com a tarifa de energia elétrica aplicada pela concessionária de energia, que é estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pode mudar de uma região para outra, sendo influenciada por fatores por diversos fatores, como por exemplo:

1. Custo de geração: O custo de geração de energia elétrica pode variar em função da fonte de energia utilizada. Por exemplo, a geração de energia a partir de hidrelétricas pode ter custos diferentes da geração a partir de usinas termelétricas, solares ou eólicas. Mudanças nos custos de combustíveis, como carvão, gás natural ou petróleo, podem afetar o custo de geração e, consequentemente, a tarifa de energia.
2. Custo de transmissão e distribuição: Os custos associados à transmissão e distribuição da energia elétrica também podem influenciar a tarifa. Isso inclui a manutenção e expansão da infraestrutura de transmissão e distribuição, investimentos em redes de transmissão e distribuição, bem como a remuneração das concessionárias pela prestação desses serviços.
3. Encargos setoriais e tributos: Existem diversos encargos setoriais e tributos que são aplicados na tarifa de energia elétrica, como PIS/PASEP, COFINS, ICMS, CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), entre outros. Mudanças na legislação ou nas políticas governamentais podem impactar a composição da tarifa de energia elétrica.
4. Investimentos em fontes de energia renovável: O investimento em fontes de energia renovável, como solar, eólica e biomassa, pode ter impacto na tarifa de energia elétrica. A expansão dessas fontes de geração de energia pode envolver custos de investimentos iniciais, operação e manutenção, que podem influenciar a tarifa.

5. Câmbio e inflação: Mudanças nas taxas de câmbio e a inflação podem afetar os custos associados à importação de equipamentos e insumos para o setor elétrico, o que pode impactar a tarifa de energia elétrica.
6. Política tarifária e regulação: A política tarifária e a regulação do setor elétrico, estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e outros órgãos reguladores, podem ter impacto na variação da tarifa de energia elétrica. Mudanças nas regras de cálculo tarifário, metodologias de revisão tarifária, contratos de concessão e outras decisões regulatórias podem afetar o valor final da tarifa.
7. Fatores climáticos: Grande parte da matriz energética brasileira é composta por uma matéria prima renovável, que é fornecida pela natureza, como a chuva, o vento e o sol. Alterações naturais em seu ciclo de fornecimento podem afetar significativamente o valor da tarifa.

O valor da tarifa de energia é imprevisível, e sofre alterações por diversos fatores. Assim, o projeto PPP Energia Limpa do Piauí gera uma grande vantagem financeira para o Estado, que é a previsibilidade de custo, visto que o valor da energia paga pelo projeto de PPP é definida por uma contraprestação mensal, que é ajustada anualmente pelo IPCA, garantindo uma entrega de energia definida no ato da contratação.

A seguir, será apresentado o custo do R\$/kWh do contrato a ser avaliado por este relatório:

#### **Variáveis**

*Valor da Contraprestação: R\$ 387.500,00*

*Valor Médio de Geração: 650.000 kWh/mês*

$$(i) \quad \text{Custo Médio de Energia da PPP} = \frac{\text{Valor da Contraprestação}}{\text{Valor Médio de Energia Gerada}}$$


$$(ii) \quad \text{Custo Médio de Energia da PPP} = \frac{R\$ 387.500,00}{650.000,00 \text{ kWh}}$$

$$(iii) \quad \text{Custo Médio de Energia da PPP} = 0,59 \text{ R\$/kWh}$$



Considerando o valor da contraprestação na data da licitação, podemos concluir que o custo médio do kWh do Contrato 07/2020 , é de 0,59 R\$/kWh (cinquenta e nove centavos por quillowatt hora), que está abaixo do valor comercializado pela distribuidora de energia elétrica Equatorial Piauí, que tem uma tarifa unitária com tributos de 0,74 R\$/kWh para os consumidores grupo B3 (RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.146, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022).

Gráfico 1 - Comparativo de custo de energia para o grupo B3

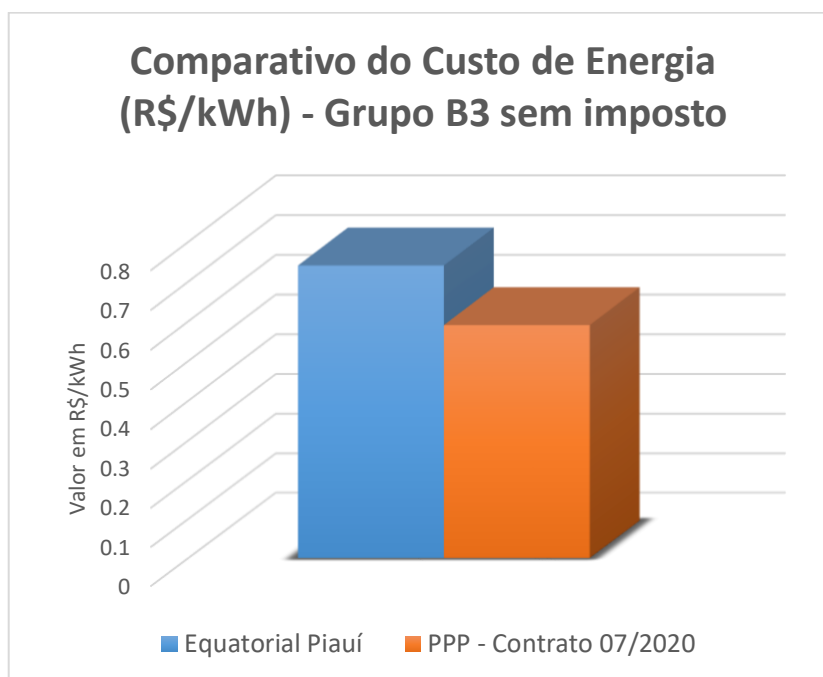


Fonte: Elaboração Própria (2023)

Os dados de avaliação da vantajosidade financeira serão desenvolvidos ao longo do processo de verificação, no qual o tópico referente a geração de energia será apresentado os valores atualizados e em uma linha histórica, com o objetivo de avaliar o custo geral do kWh/mês.

## 6. VISITA TÉCNICA

Do dia 07 de fevereiro de 2024, o verificador visitou a usina. Na sequência, algumas imagens feitas no local.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GD Rio Poti Energia Campo Maior<br/>S 4° 52' 22" W 42° 12' 18"<br/>54° NE<br/>7 de fev. de 2024 10:01:42</p>   | <p>RF07_52: Skid de transformação com operação plena.</p>                                                     |
|  <p>GD Rio Poti Energia Campo Maior<br/>S 4° 52' 22" W 42° 12' 16"<br/>207° SW<br/>7 de fev. de 2024 10:03:37</p> | <p>RF07_53: Todos os inversores da usina estão com a área de entorno limpa, similar ao da imagem ao lado.</p> |
|  <p>GD Rio Poti Energia Campo Maior<br/>S 4° 52' 22" W 42° 12' 13"<br/>45° NE<br/>7 de fev. de 2024 10:05:11</p> | <p>RF07_54: Skid de transformação com operação plena.</p>                                                     |
|  <p>GD Rio Poti Energia Campo Maior<br/>S 4° 52' 22" W 42° 12' 18"<br/>54° NE<br/>7 de fev. de 2024 10:01:45</p> | <p>RF07_55: Vegetação da área da usina sob controle.</p>                                                      |

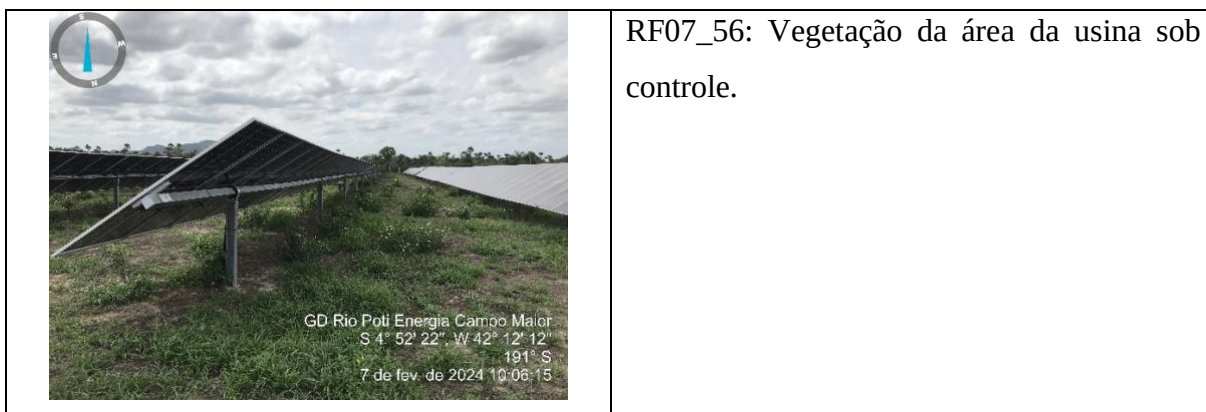

RF07\_56: Vegetação da área da usina sob controle.

O representante da SPE que estava no local durante a visita informou as seguintes ocorrências no local: Inversor 04 reiniciando, Cabine Primária desligada oito vezes (sete desarmes e um desligamento programado para a troca de TP), e módulos danificados, que ainda não foram contabilizados o total, porém o processo de substituição está encaminhado.

## 7. LISTA DE RATEIO DAS UNIDADES BENEFICIADAS

A miniusina fotovoltaica está cadastrada na modalidade de autoconsumo remoto, em que toda a energia gerada é injetada e computada pelo Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, definido pela REN 1000/2021 da ANEEL como:

*XLV-A - Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE: sistema no qual a energia elétrica ativa é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)*

Para participar do SCEE é necessário a apresentação da Lista de Rateio para a distribuidora de energia elétrica Equatorial Piauí, logo, a concessionária Rio Poti Energia enviou a lista das unidades consumidoras contendo o percentual de energia que irá receber da usina, conforme exposto na tabela abaixo, e conforme a regulação vigente os créditos de energia serão compensados em até 60 dias após a conexão elétrica.

Tabela 3 - Lista de rateio das unidades consumidoras da SEAD.

|   | % KWH  | CONTA CONTRATO | CLASSE DE CONSUMO | ENDEREÇO                                                     |
|---|--------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 0,586% | 2525801        | Poder Público     | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |

|    |         |          |               |                                                              |
|----|---------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2  | 0,450%  | 2455137  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 3  | 1,736%  | 2874318  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI    |
| 4  | 5,282%  | 14407540 | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 5  | 0,450%  | 2282542  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 6  | 0,000%  | 3112063  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 7  | 0,000%  | 3007448  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 8  | 0,021%  | 7497717  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 9  | 5,941%  | 14109492 | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 10 | 4,090%  | 13855654 | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 11 | 0,324%  | 2762714  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 12 | 0,188%  | 3139085  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 13 | 54,942% | 270342   | Poder Público | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| 14 | 0,209%  | 2402360  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 15 | 0,126%  | 3128750  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 16 | 0,063%  | 1249096  | Poder Público | CENTRO ADMINISTRATIVO SEAD ESPACO CIDADANIA PARNAIBA         |
| 17 | 0,063%  | 8261300  | Poder Público | CENTRO ADMINISTRATIVO SEAD                                   |
| 18 | 0,512%  | 9926860  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 19 | 0,063%  | 8479941  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI    |
| 20 | 0,439%  | 2967723  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 21 | 0,554%  | 2460130  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 22 | 0,387%  | 2623994  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |
| 23 | 0,126%  | 1580370  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES |

|    |        |          |               |                                                                 |
|----|--------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 24 | 0,063% | 3077071  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES    |
| 25 | 3,608% | 475394   | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI AN    |
| 26 | 0,115% | 2504774  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES    |
| 27 | 5,250% | 3621227  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI CO    |
| 28 | 4,445% | 11810149 | Poder Público | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>ESPAÇO DA CIDADANIA C MAIO |
| 29 | 0,586% | 15375951 | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI SA    |
| 30 | 0,502% | 15490980 | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI SA    |
| 31 | 3,263% | 4590015  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI CO    |
| 32 | 4,330% | 16530900 | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES    |
| 33 | 0,429% | 9429816  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES    |
| 34 | 0,272% | 7406355  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES    |
| 35 | 0,000% | 4168194  | Poder Público | EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI S/A COLONIA    |
| 36 | 0,586% | 2525801  | Poder Público | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA ESTADO DO PIAUI ES    |

Fonte: Elaboração Própria (2023)


## 8. GERAÇÃO DE ENERGIA

A avaliação do desempenho da geração de energia da usina é fundamental para verificar se o contrato de PPP está sendo cumprido adequadamente, visto que o principal produto de entrega é a energia injetada na rede elétrica da Equatorial Piauí. Para isso, utilizamos três fontes de dados: os dados de geração do inversor, os dados de geração fornecidos pela aplicação SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition* ou Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados) e os dados de faturamento da Equatorial Piauí.

Os dados de geração do inversor são obtidos diretamente do equipamento responsável por converter a energia em corrente contínua oriunda dos módulos fotovoltaicos, em energia elétrica em corrente alternada. Eles fornecem informações precisas sobre a quantidade de energia gerada por cada arranjo fotovoltaico (*strings*). Porém, é importante salientar que esses dados podem sofrer distorções nos seus resultados, pois no caminho do inversor até a cabine de medição há perdas elétricas.

Os dados de geração fornecidos pelo software SCADA são coletados por um sistema de monitoramento que supervisiona o desempenho da usina em tempo real. Esse sistema é capaz de detectar problemas e alertar imediatamente a equipe responsável pela manutenção da usina, além de apresentar diversos parâmetros técnicos da usina. A imagem a seguir é a tela de inicial da plataforma utilizada pela Rio Poti Energia, no qual foi fornecido um usuário de acesso para o Verificador Independente acompanhar o desempenho em tempo real.

Figura 3 - Área de trabalho da plataforma SCADA utilizada pela Rio Poti Energia

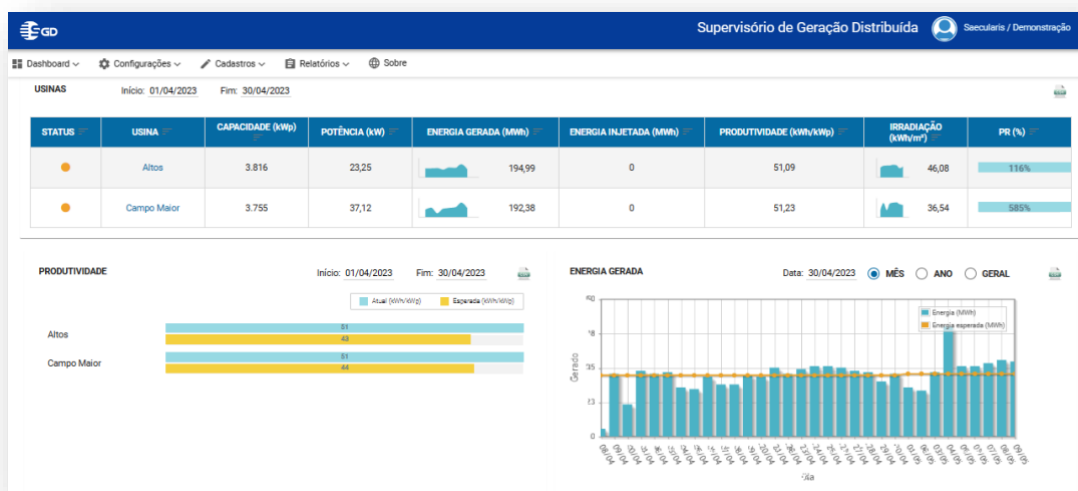

Fonte: SGD Solar - SCADA



Os dados de faturamento da Equatorial Piauí são os mais importantes para avaliar o desempenho da geração de energia da usina, uma vez que eles fornecem informações sobre a quantidade de energia efetivamente entregue à distribuidora. Esses dados também são utilizados para calcular a receita da usina e para determinar se ela está cumprindo adequadamente o contrato de PPP, conforme o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO.

Nos tópicos a seguir serão apresentadas as bases de dados utilizadas na análise dos indicadores e no faturamento.

### **8.1. DADOS DE GERAÇÃO DOS INVERSORES**

Os dados de geração são referentes a medição diária dos 14 inversores presentes na usina fotovoltaica, em que durante o período de 1 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 foi mensurado o valor de 617.252,40 kWh, conforme tabela abaixo.


Tabela 4 - Tabela de geração de energia dos inversores

| Data de Medição | Capacidade total da cadeia (kWp) | Geração PV (kWh)  | Energia específica (kWh/kWp) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 01/01/2024      | 3.652,56                         | 13.740,58         | 3,76                         |
| 02/01/2024      | 3.652,56                         | 19.623,60         | 5,37                         |
| 03/01/2024      | 3.652,56                         | 13.700,56         | 3,75                         |
| 04/01/2024      | 3.652,56                         | 19.830,38         | 5,43                         |
| 05/01/2024      | 3.652,56                         | 16.779,21         | 4,59                         |
| 06/01/2024      | 3.652,56                         | 22.497,11         | 6,16                         |
| 07/01/2024      | 3.652,56                         | 16.930,67         | 4,64                         |
| 08/01/2024      | 3.755,16                         | 20.145,15         | 5,36                         |
| 09/01/2024      | 3.755,16                         | 22.422,48         | 5,97                         |
| 10/01/2024      | 3.755,16                         | 20.468,99         | 5,45                         |
| 11/01/2024      | 3.755,16                         | 11.857,26         | 3,16                         |
| 12/01/2024      | 3.755,16                         | 11.579,08         | 3,08                         |
| 13/01/2024      | 3.755,16                         | 17.858,65         | 4,76                         |
| 14/01/2024      | 3.755,16                         | 20.120,36         | 5,36                         |
| 15/01/2024      | 3.755,16                         | 23.311,59         | 6,21                         |
| 16/01/2024      | 3.755,16                         | 15.194,33         | 4,05                         |
| 17/01/2024      | 3.755,16                         | 23.799,02         | 6,34                         |
| 18/01/2024      | 3.755,16                         | 27.224,03         | 7,25                         |
| 19/01/2024      | 3.755,16                         | 28.251,89         | 7,52                         |
| 20/01/2024      | 3.755,16                         | 23.547,01         | 6,27                         |
| 21/01/2024      | 3.755,16                         | 25.519,22         | 6,80                         |
| 22/01/2024      | 3.755,16                         | 16.788,88         | 4,47                         |
| 23/01/2024      | 3.755,16                         | 23.400,54         | 6,23                         |
| 24/01/2024      | 3.755,16                         | 17.180,41         | 4,58                         |
| 25/01/2024      | 3.755,16                         | 23.393,91         | 6,23                         |
| 26/01/2024      | 3.755,16                         | 20.810,50         | 5,54                         |
| 27/01/2024      | 3.755,16                         | 14.453,16         | 3,85                         |
| 28/01/2024      | 3.755,16                         | 21.267,62         | 5,66                         |
| 29/01/2024      | 3.755,16                         | 16.204,02         | 4,32                         |
| 30/01/2024      | 3.755,16                         | 23.759,99         | 6,33                         |
| 31/01/2024      | 3.755,16                         | 25.592,20         | 6,82                         |
| <b>TOTAL</b>    |                                  | <b>617.252,40</b> |                              |

Fonte: Base de dados dos inversores



Gráfico 2 - Geração de energia no mês de Janeiro

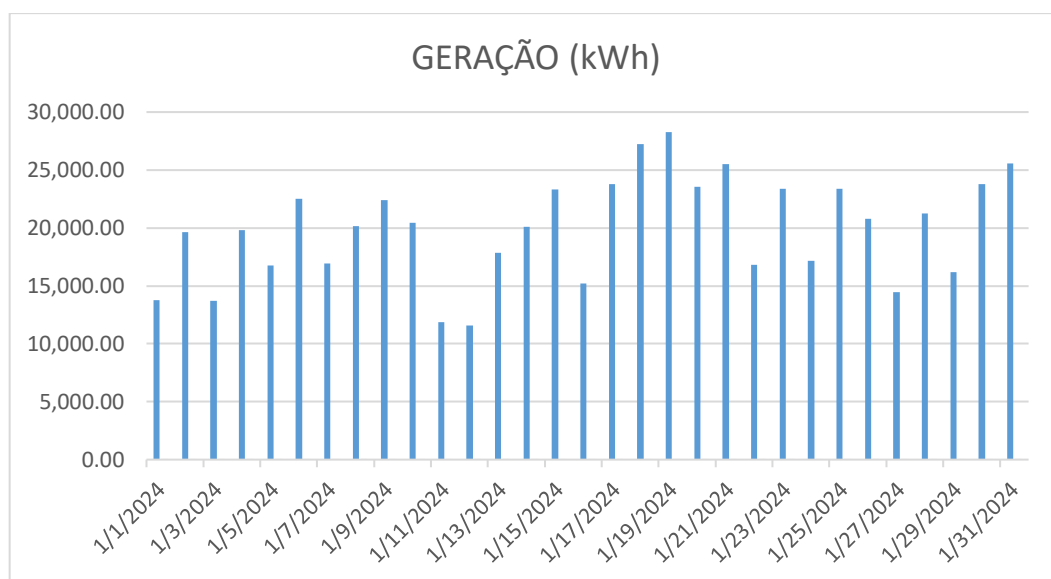

Fonte: Base de dados dos inversores

## 8.2. DADOS FORNECIDOS PELO SCADA


Os dados fornecidos pelo SCADA não apresentam as casas centesimais, comprometendo a avaliação do indicador de geração, assim os dados apresentados pela plataforma não serão utilizados para validação da geração no mês de janeiro de 2024.

*Tabela 5 - Base de dados fornecidos pelo SCADA*

| Dia          | Energia Gerada (kWh) |
|--------------|----------------------|
| 01/01/2024   | 13.000,00            |
| 02/01/2024   | 19.000,00            |
| 03/01/2024   | 13.000,00            |
| 04/01/2024   | 19.000,00            |
| 05/01/2024   | 16.000,00            |
| 06/01/2024   | 22.000,00            |
| 07/01/2024   | 16.000,00            |
| 08/01/2024   | 20.000,00            |
| 09/01/2024   | 22.000,00            |
| 10/01/2024   | 20.000,00            |
| 11/01/2024   | 11.000,00            |
| 12/01/2024   | 11.000,00            |
| 13/01/2024   | 17.000,00            |
| 14/01/2024   | 20.000,00            |
| 15/01/2024   | 23.000,00            |
| 16/01/2024   | 15.000,00            |
| 17/01/2024   | 23.000,00            |
| 18/01/2024   | 27.000,00            |
| 19/01/2024   | 28.000,00            |
| 20/01/2024   | 23.000,00            |
| 21/01/2024   | 25.000,00            |
| 22/01/2024   | 16.000,00            |
| 23/01/2024   | 23.000,00            |
| 24/01/2024   | 17.000,00            |
| 25/01/2024   | 23.000,00            |
| 26/01/2024   | 20.000,00            |
| 27/01/2024   | 14.000,00            |
| 28/01/2024   | 21.000,00            |
| 29/01/2024   | 16.000,00            |
| 30/01/2024   | 23.000,00            |
| 31/01/2024   | 25.000,00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>601.000,00</b>    |

Fonte: SGD Solar - SCADA

Gráfico 3 - Geração de energia no mês de Janeiro

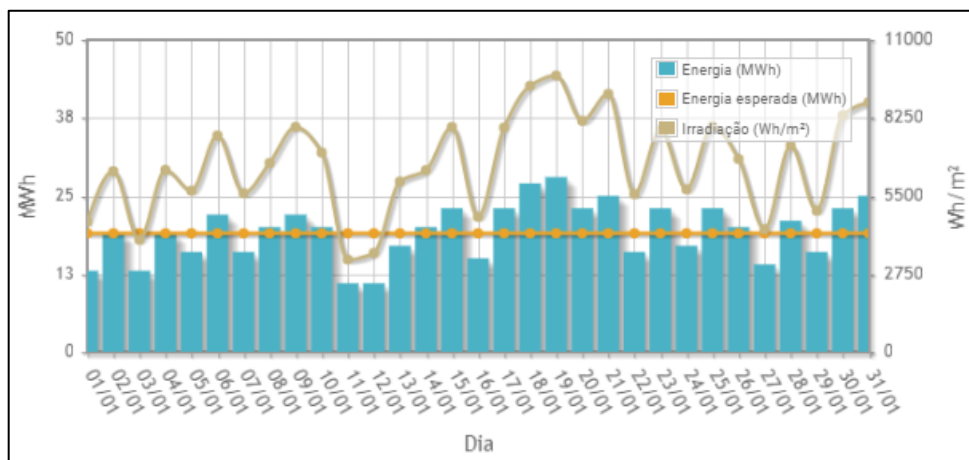

Fonte: SGD Solar - SCADA

## 9. FATURAMENTO CONTRATO 07/2020

Nos tópicos a seguir será analisado o cálculo de geração utilizado no faturamento, o valor cobrado pela SPE e a avaliação do custo por kWh (R\$/kWh).

### 9.1. AVALIAÇÃO DOS DADOS DE GERAÇÃO DA FATURA

A Rio Poti Energia enviou para a Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC, na data de 05 de fevereiro de 2024, o Ofício Rio Poti 08/2024 contendo em anexo o Relatório de Faturamento, Recibo Eletrônico de Protocolo no SEI do processo 00002.001177/2024-99, além de todos os documentos necessários para a solicitação de faturamento, conforme imagem abaixo.

Figura 4 - Documentos protocolados pela SPE

|                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2/5/24, 4:05 PM                                                     | SEI/GOV-PI - 011028339 - Recibo Eletrônico de Protocolo |
| Recibo Eletrônico de Protocolo - 011028339                          |                                                         |
| Usuário Externo (signatário):                                       | Elizeu Batista Campos                                   |
| IP utilizado:                                                       | 189.83.151.81                                           |
| Data e Horário:                                                     | 05/02/2024 16:04:08                                     |
| Tipo de Peticionamento:                                             | Intercorrente                                           |
| Número do Processo:                                                 | 00002.001177/2024-99                                    |
| Relacionado ao Processo Indicado:                                   | 00010.002573/2020-19                                    |
| Protocolos dos Documentos (Número SEI):                             |                                                         |
| - Ofício OFICIO 082024                                              | 011028323                                               |
| - Relatório RELATORIO TECNICO REF JANEIRO24                         | 011028324                                               |
| - Certidão - Tributos Municipais CND MUNICIPAL                      | 011028326                                               |
| - Certidão - Tributos Estaduais CND ESTADUAL                        | 011028327                                               |
| - Certidão Negativa de Débitos - CND CND ESTADUAL PGE               | 011028329                                               |
| - Certidão - FGTS CND FGTS                                          | 011028331                                               |
| - Certidão - Tributos Federais CND FEDERAL                          | 011028332                                               |
| - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) CNDT TRABALHISTA | 011028333                                               |
| - Guia GUIA INSS                                                    | 011028334                                               |
| - Guia GUIA FGTS                                                    | 011028335                                               |
| - Comprovante PAGTO GUIA INSS                                       | 011028336                                               |
| - Comprovante PAGTO GUIA FGTS                                       | 011028337                                               |

Fonte: SEI Piauí < [< Governo do Piauí \(portal.pi.gov.br\)>](http://Governo do Piauí (portal.pi.gov.br)) >

No cálculo de geração de energia presente no Relatório de Faturamento, com o objetivo de avaliar o Indicador de Desempenho 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO, a SPE apresentou a base de cálculo exposta na figura abaixo:

Figure 1 - Base de cálculo do faturamento de energia apresentado pela SPE

| CÁLCULO                                                                                                                                                        |  |                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|
| Mês da apuração: JANEIRO                                                                                                                                       |  |                                     |         |
| MEDIÇÃO ANTERIOR                                                                                                                                               |  | MEDIÇÃO ATUAL                       |         |
| <b>6.643.658,53 KWh</b>                                                                                                                                        |  | <b>7.260.910,93 KWh<sup>0</sup></b> |         |
| 31/12/2023                                                                                                                                                     |  | 31/01/2024                          |         |
| Energia Gerada <sup>1</sup> : <b>617.252,40 KWh</b>                                                                                                            |  |                                     |         |
| Energia Esperada (EVTEA): <b>650.000,00 KWh</b>                                                                                                                |  |                                     |         |
| Energia Faturada <sup>2</sup> : <b>650.000,00 KWh</b>                                                                                                          |  |                                     |         |
| Saldo Anterior: <b>142.566,57 KWh</b>                                                                                                                          |  |                                     |         |
| Saldo Atual: <b>109.818,97 KWh</b>                                                                                                                             |  |                                     |         |
| Índice Redutor: <b>1,00</b>                                                                                                                                    |  |                                     |         |
|                                                                                                                                                                |  | Tempo de Saldo:                     | 4 meses |
| (0) Medição Atual = Energia acumulada até a data informada da realização da leitura no medidor.                                                                |  |                                     |         |
| (1) Energia Gerada = Energia injetada na rede. Corresponde a diferença entre a Medição Atual e a Anterior                                                      |  |                                     |         |
| (2) Energia faturada = Energia recebida pelo Governo do Estado do Piauí. Corresponde a Energia Gerada + Saldo Anterior, limitado ao faturamento de 650.000kWh. |  |                                     |         |

Fonte: Rio Poti Energia

Para a checagem dos dados de faturamento temos que:

Medição Inicial = Energia acumulada desde o início da geração até o mês de avaliação

Medição Final = Medição Inicial + geração do mês de avaliação

Energia Contratada = 650.000 kWh

Energia Faturada = Geração de energia contabilizada pela EQUATORIAL PIAUÍ, cujo ideal é que esteja acima do valor de Energia Contratada, e caso não ocorra esta condição, o valor da Energia Faturada deve ser somado com a energia do Saldo do Mês Anterior presente no Banco de Créditos.

Os dados apresentados a seguir consideram os valores de geração do mês de janeiro de 2024 presentes no item 8.1.. Assim, temos que:

- (i) *MEDIÇÃO INICIAL* = 6.643.658,53 kWh
- (ii) *MEDIÇÃO FINAL* = 6.643.658,53 kWh + 617.252,40 kWh = 7.260.910,93 kWh
- (iii) *GERAÇÃO MÉDIA ESPERADA* = 650.000,00 kWh
- (iv) *ENERGIA FATURADA* = 7.260.910,93 kWh - 6.643.658,53 kWh, se < 650.000, somar com *SALDO MÊS ANTERIOR*, se > 650.000 retira-se o excedente para adicionar ao banco de créditos.
  - a. *ENERGIA MEDIDA* = 617.252,40 kWh, é < 650.000,00
  - b. *ENERGIA ADIC. AO BANCO DE CRÉDITO* = -32.747,60 kWh
  - c. *ENERGIA RETIRADA DO BANCO DE CRÉDITO* = +32.747,60 kWh
  - d. *ENERGIA FATURADA* = 650.000,00 kWh

Tabela 6 - Tabela de faturamento da SPE

| TABELA DE FATURAMENTO |                                        |                  |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1                     | MEDIÇÃO INICIAL                        | 6.643.658,53 kWh |
| 2                     | MEDIÇÃO FINAL                          | 7.260.910,93 kWh |
| 3                     | GERAÇÃO DE ENERGIA JANEIRO – SPE*      | 617.252,40 kWh   |
| 4                     | GERAÇÃO MÉDIA ESPERADA                 | 650.000,00 kWh   |
| 5                     | ENERGIA FATURADA JANEIRO               | 650.000,00 kWh   |
| 6                     | SALDO PARA O BANCO DE CRÉDITOS JANEIRO | -32.747,60 kWh   |

Fonte: Elaboração própria


Na tabela a seguir consta o histórico de geração produzido pela usina.

Tabela 7 - Base de dados de geração

| PERÍODO                                             | VALOR DE GERAÇÃO (kWh) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Março de 2023                                       | 755.301,27             |
| Abril de 2023                                       | 561.011,22             |
| Mai de 2023                                         | 654.962,52             |
| Junho de 2023                                       | 625.761,00             |
| Julho de 2023                                       | 697.217,75             |
| Agosto de 2023                                      | 649.706,67             |
| Setembro de 2023                                    | 720.883,21             |
| Outubro de 2023                                     | 745.690,67             |
| Novembro de 2023                                    | 646.606,66             |
| Dezembro de 2023                                    | 581.800,21             |
| Janeiro de 2024                                     | 617.252,40             |
| <b>MÉDIA ESPERADA <math>\geq</math> 650.000 kWh</b> | <b>659.653,96</b>      |

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 4 - Histórico de geração mensal de 2023

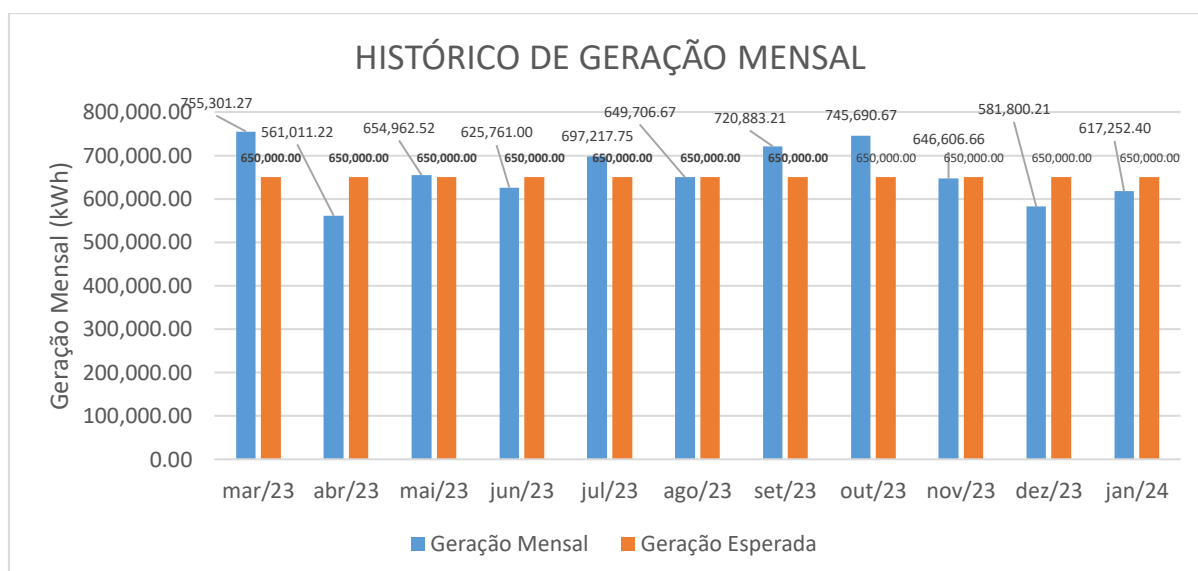

Fonte: Elaboração própria

Na etapa de faturamento o banco de crédito é um item a ser mensurado e acompanhado ao longo da concessão, pois haverá períodos em que a geração será inferior ao valor esperado,

ou poderá haver uma ocorrência que necessite do desligamento da usina por um determinado período, assim, o banco de créditos será uma ferramenta de segurança da SPE para o atendimento das obrigações contratuais.


Ao fim do ciclo de faturamento de 12 meses, será realizado uma avaliação geral do desempenho do projeto com base nos dados emitidos pela Distribuidora de Energia Elétrica Local.

*Tabela 8 - Base dados do Banco de Crédito*

| PERÍODO          | VALOR UTILIZADO | VALOR DEPOSITADO | VALOR TOTAL    |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Março de 2023    | 0,00 kWh        | 105.301,27 kWh   | 105.301,27 kWh |
| Abril de 2023    | 88.988,78 kWh   | 0,00 kWh         | 16.312,49 kWh  |
| Maio de 2023     | 0,00 kWh        | 4.962,52 kWh     | 21.275,01 kWh  |
| Junho de 2023    | 21.275,01 kWh   | 0,00 kWh         | -2.963,99 kWh  |
| Julho de 2023    | 0,00 kWh        | 47.229,43 kWh    | 44.265,44 kWh  |
| Agosto de 2023   | 293,33 kWh      | 0,00 kWh         | 43.972,11 kWh  |
| Setembro de 2023 | 0,00 kWh        | 70.883,21 kWh    | 114.855,32 kWh |
| Outubro de 2023  | 0,00 kWh        | 95.690,67 kWh    | 210.545,99 kWh |
| Novembro de 2023 | 3.393,34 kWh    | 0,00 kWh         | 207.152,65 kWh |
| Dezembro de 2023 | 68.199,79 kWh   | 0,00 kWh         | 138.952,86 kWh |
| Janeiro de 2024  | 32.747,60 kWh   | 0,00 kWh         | 106.205,26 kWh |

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 5 - Base de dados do Banco de Crédito

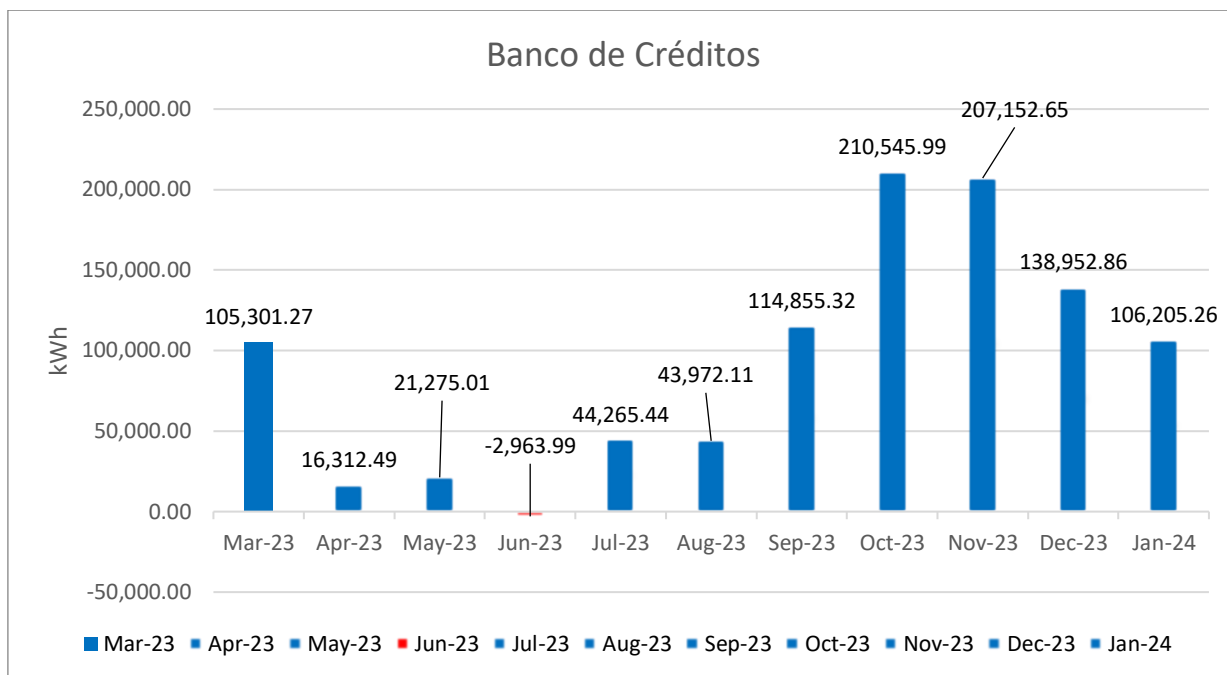

Fonte: Elaboração própria

## 9.2. AVALIAÇÃO DO VALOR COBRADO

Os valores de faturamento apresentado pela SPE constam o montante total da contraprestação reajustada pela inflação, utilizando o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA conforme o item 16.21 do Contrato de PPP.

*“16.21.1. O primeiro reajuste será aplicado após 12 (doze) meses da assinatura deste CONTRATO, e serão aplicados a cada período de 12 (doze) meses contados do último reajuste ocorrido.”*

Assim, o primeiro reajuste da contraprestação anual do contrato 03/2020 ocorrerá no período entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, com um valor a ser reajustado de R\$ 387.500,00. Portanto, o valor final do **primeiro reajuste é de R\$ 435.032,83**.



Tabela 9 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 1

| Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)     |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) |                         |
| Dados informados                           |                         |
| Data inicial                               | 12/2020                 |
| Data final                                 | 12/2021                 |
| Valor nominal                              | R\$ 387.500,00 ( REAL ) |
| Dados calculados                           |                         |
| Índice de correção no período              | 1,11546880              |
| Valor percentual correspondente            | 11,546880 %             |
| Valor corrigido na data final              | R\$ 432.244,16 ( REAL ) |

Fonte: [Banco Central do Brasil](http://Banco Central do Brasil)

O segundo reajuste anual da contraprestação ocorre na data inicial de dezembro de 2021 e data final de dezembro de 2022, cujo valor a ser reajustado é de R\$ 432.244,16. **Dessa forma, o valor final da contraprestação mensal a ser pago no ano de 2023 é de R\$ 460.586,71.**

Tabela 10 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 2

| Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)     |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) |                         |
| Dados informados                           |                         |
| Data inicial                               | 12/2021                 |
| Data final                                 | 12/2022                 |
| Valor nominal                              | R\$ 432.244,16 ( REAL ) |
| Dados calculados                           |                         |
| Índice de correção no período              | 1,06557070              |
| Valor percentual correspondente            | 6,557070 %              |
| Valor corrigido na data final              | R\$ 460.586,71 ( REAL ) |

Fonte: [Banco Central do Brasil](http://Banco Central do Brasil)

O terceiro reajuste anual da contraprestação ocorre na data inicial de dezembro de 2022 e data final de dezembro de 2023, cujo valor a ser reajustado é de R\$ 460.586,71. **Dessa forma, o valor final da contraprestação mensal a ser pago no ano de 2024 é de R\$ 484.858,52.**

*Tabela 11 - Correção da contraprestação máxima mensal do ano 3*

| Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)     |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Correção de valores: TR                    |                         |
| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) |                         |
| Dados informados                           |                         |
| Data inicial                               | 12/2022                 |
| Data final                                 | 12/2023                 |
| Valor nominal                              | R\$ 460.586,71 ( REAL ) |
| Dados calculados                           |                         |
| Índice de correção no período              | 1,05269760              |
| Valor percentual correspondente            | 5,269760 %              |
| Valor corrigido na data final              | R\$ 484.858,52 ( REAL ) |

Fonte: [Banco Central do Brasil](https://www.bcb.gov.br/indicadores/indicadores-de-precos)

Em consoante aos reajustes anuais estabelecidos no item 16.21.1 do contrato de PPP, o faturamento apresentado pela SPE referente ao mês de janeiro de 2024 é apresentado o valor de contraprestação total de **R\$ 484.858,53 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).**

**Tendo em vista que a Concessionária cumpriu com sua obrigação contratual de entrega de energia, o valor cobrado ao Poder Concedente está em conformidade.**

Tabela 12 - Situação de regularidade das cobranças de faturamento

| PERÍODO           | VALOR          | SITUAÇÃO        |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Março de 2023     | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Abril de 2023     | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Mai de 2023       | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Junho de 2023     | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Julho de 2023     | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Agosto de 2023    | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Setembro de 2023  | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Outubro de 2023   | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Novembro de 2023  | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Dezembro de 2023* | R\$ 460.586,71 | Em conformidade |
| Janeiro de 2024   | R\$ 484.858,53 | Em conformidade |

Fonte: Elaboração Própria

### 9.3. BASE HISTÓRICA DO CUSTO DO kWh DA PPP

Utilizando as definições apresentadas no Item 5 deste relatório, aplicando o valor da contraprestação com o valor corrigido e o **valor da geração do mês de janeiro** mensurados, temos que:

#### Variáveis

*Valor da Contraprestação: R\$ 484.858,52*

*Valor Médio de Geração: 617.252,40 kWh /mês*


$$(i) \quad \text{Custo Médio de Energia da PPP} = \frac{\text{Valor da Contraprestação}}{\text{Valor Médio de Energia Gerada}}$$

$$(ii) \quad \text{Custo Médio de Energia da PPP} = \frac{R\$ 484.858,52}{617.252,40 \text{ kWh}}$$

$$(iii) \quad \text{Custo Médio de Energia da PPP} = 0,78 \text{ R\$/kWh}$$

Com base no valor atualizado da contraprestação mensal e o valor de kWh gerados no mês, temos que o custo médio do kWh do Contrato 07/2020 referente a janeiro de 2024, é de 0,78 R\$/kWh.

Gráfico 6 - Custo do kWh do projeto de PPP

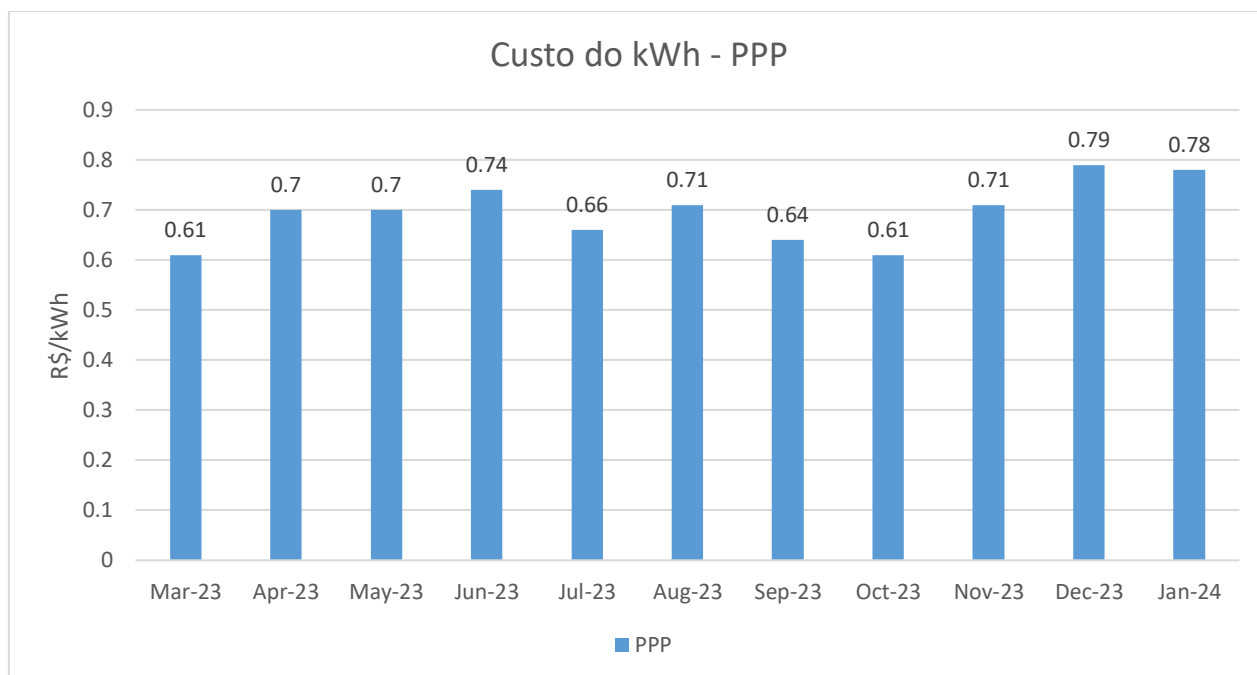

Fonte: Elaboração própria


A seguir é apresentado a tabela da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 3.292/23 com as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo A, além do gráfico demonstrado o comparativo do custo de energia sem impostos para as unidades consumidoras do Grupo A.

Figura 5 - Tarifas aplicadas Grupo A3 (sem imposto)

| SUBGRUPO        | MODALIDADE    | ACESSANTE             | POSTO | TARIFAS DE APLICAÇÃO |          |         | BASE ECONÔMICA |          |         |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
|                 |               |                       |       | TUSD                 |          |         | TUSD           |          |         |
|                 |               |                       |       | R\$/kW               | R\$/MWh  | R\$/MWh | R\$/kW         | R\$/MWh  | R\$/MWh |
| A2 (88 a 138kV) | GERAÇÃO       | EOL PORTO DO DELTA    | NA    | 10,29                | 0,00     | 0,00    | 10,29          | 0,00     | 0,00    |
|                 |               | EOL PORTO DAS BARCAS  | NA    | 6,59                 | 0,00     | 0,00    | 6,59           | 0,00     | 0,00    |
|                 |               | EOL PORTO SALGADO     | NA    | 6,60                 | 0,00     | 0,00    | 6,60           | 0,00     | 0,00    |
|                 |               | EOL DELTA DO PARNAIBA | NA    | 6,59                 | 0,00     | 0,00    | 6,59           | 0,00     | 0,00    |
|                 |               | EOL TESTA BRANCA I    | NA    | 5,47                 | 0,00     | 0,00    | 5,40           | 0,00     | 0,00    |
|                 |               | EOL TESTA BRANCA III  | NA    | 5,47                 | 0,00     | 0,00    | 5,40           | 0,00     | 0,00    |
|                 |               | NOVO GERADOR          | NA    | 5,69                 | 0,00     | 0,00    | 5,61           | 0,00     | 0,00    |
| A3 (69kV)       | AZUL          | NÃO SE APLICA         | P     | 38,12                | 61,29    | 430,01  | 37,12          | 66,25    | 445,28  |
|                 |               |                       | FP    | 18,53                | 61,29    | 270,25  | 17,64          | 66,25    | 278,38  |
|                 | AZUL APE      | NÃO SE APLICA         | P     | 38,12                | 15,34    | 0,00    | 37,12          | 16,03    | 0,00    |
|                 |               |                       | FP    | 18,53                | 15,34    | 0,00    | 17,64          | 16,03    | 0,00    |
|                 | SCEE - AZUL   | NÃO SE APLICA         | P     | 38,12                | 61,29    | 48,37   | 37,12          | 66,25    | 46,59   |
|                 |               |                       | FP    | 18,53                | 61,29    | 48,37   | 17,64          | 66,25    | 46,59   |
|                 | DISTRIBUIÇÃO  | EQUATORIAL MA         | P     | 25,50                | 4,94     | 0,00    | 23,97          | 5,09     | 0,00    |
| FP              |               |                       | 17,46 | 4,94                 | 0,00     | 16,33   | 5,09           | 0,00     |         |
| A3a (30 a 44kV) | GERAÇÃO       | NÃO SE APLICA         | NA    | 0,00                 | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00    |
|                 |               |                       | NA    | 15,90                | 0,00     | 0,00    | 16,21          | 0,00     | 0,00    |
|                 | AZUL          | NÃO SE APLICA         | P     | 94,83                | 108,31   | 430,80  | 95,17          | 114,85   | 446,08  |
|                 |               |                       | FP    | 35,23                | 108,31   | 271,04  | 35,17          | 114,85   | 279,19  |
|                 | AZUL APE      | NÃO SE APLICA         | P     | 94,83                | 45,88    | 0,00    | 95,17          | 47,94    | 0,00    |
|                 |               |                       | FP    | 35,23                | 45,88    | 0,00    | 35,17          | 47,94    | 0,00    |
|                 | SCEE - AZUL   | NÃO SE APLICA         | P     | 94,83                | 108,31   | 49,17   | 95,17          | 114,85   | 47,39   |
|                 |               |                       | FP    | 35,23                | 108,31   | 49,17   | 35,17          | 114,85   | 47,39   |
|                 | VERDE         | NÃO SE APLICA         | NA    | 35,23                | 0,00     | 0,00    | 35,17          | 0,00     | 0,00    |
|                 |               |                       | P     | 0,00                 | 2.408,80 | 430,80  | 0,00           | 2.423,94 | 446,08  |
|                 |               |                       | FP    | 0,00                 | 108,31   | 271,04  | 0,00           | 114,85   | 279,19  |
|                 | VERDE APE     | NÃO SE APLICA         | NA    | 35,23                | 0,00     | 0,00    | 35,17          | 0,00     | 0,00    |
|                 |               |                       | P     | 0,00                 | 2.346,37 | 0,00    | 0,00           | 2.357,03 | 0,00    |
| FP              |               |                       | 0,00  | 45,88                | 0,00     | 0,00    | 47,94          | 0,00     |         |
| SCEE - VERDE    | NÃO SE APLICA | NA                    | 35,23 | 0,00                 | 0,00     | 35,17   | 0,00           | 0,00     |         |
|                 |               | P                     | 0,00  | 2.408,80             | 49,17    | 0,00    | 2.423,94       | 47,39    |         |
|                 |               | FP                    | 0,00  | 108,31               | 49,17    | 0,00    | 114,85         | 47,39    |         |
| DISTRIBUIÇÃO    | EQUATORIAL MA | P                     | 37,33 | 16,72                | 0,00     | 36,26   | 17,23          | 0,00     |         |
|                 |               | FP                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00     |         |

Fonte: ANEEL (<https://www.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf>)

Gráfico 7 - Comparativo do custo do kWh entre o projeto de PPP e o Grupo A (sem imposto)

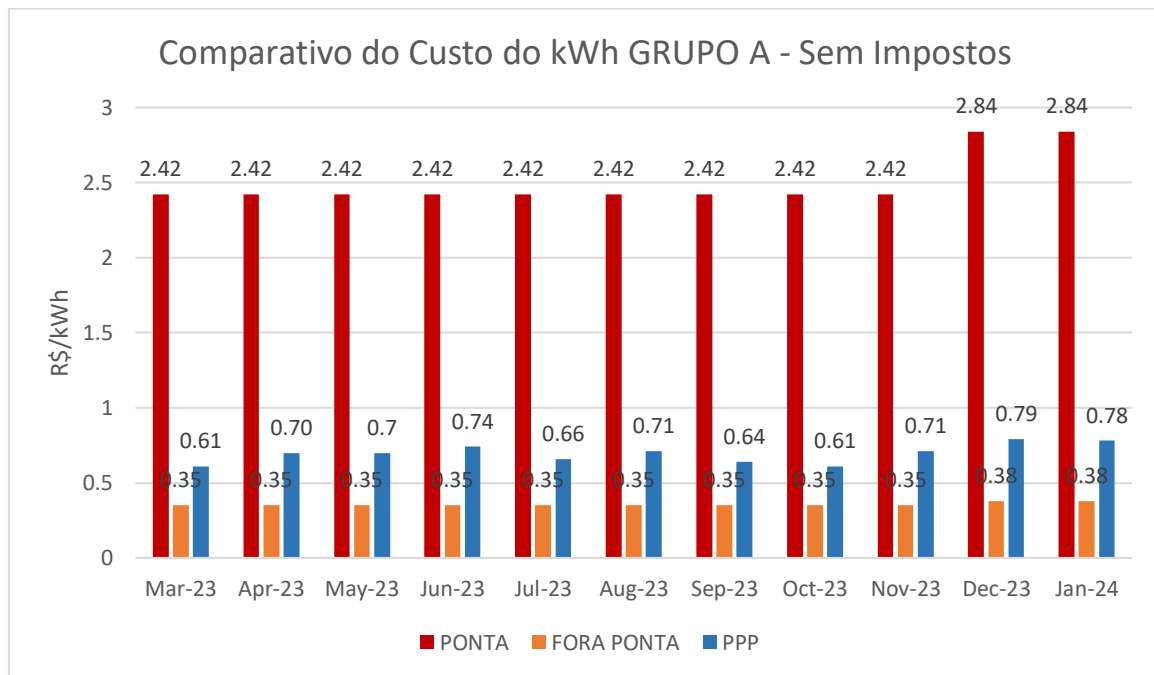

Fonte: Elaboração própria


A seguir é apresentado a tabela da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 3146/22 com as tarifas para as unidades consumidoras do Grupo B, além do gráfico demonstrado o comparativo do custo de energia sem impostos para as unidades consumidoras do Grupo B3.

Figura 6 - Tarifas aplicadas Grupo B (sem imposto)

| SUBGRUPO | MODALIDADE                        | CLASSE      | SUBCLASSE   | POSTO | TARIFAS DE APLICAÇÃO |          |         | TARIFAS BASE ECONÔMICA |          |         |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------------|----------|---------|------------------------|----------|---------|
|          |                                   |             |             |       | TUSD                 |          | TE      | TUSD                   |          | TE      |
|          |                                   |             |             |       | R\$/kw               | R\$/MWh  | R\$/MWh | R\$/kw                 | R\$/MWh  | R\$/MWh |
| B1       | BRANCA                            | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P     | 0,00                 | 1.486,18 | 431,37  | 0,00                   | 1.500,16 | 446,66  |
|          |                                   |             |             | INT   | 0,00                 | 952,43   | 271,61  | 0,00                   | 964,05   | 279,77  |
|          |                                   |             |             | FP    | 0,00                 | 418,68   | 271,61  | 0,00                   | 427,94   | 279,77  |
|          | PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL        | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
|          | PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL        | RESIDENCIAL | BAIXA RENDA | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
|          | SCEE - BRANCA                     | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P     | 0,00                 | 1.486,18 | 431,37  | 0,00                   | 1.500,16 | 446,66  |
|          |                                   |             |             | INT   | 0,00                 | 952,43   | 271,61  | 0,00                   | 964,05   | 279,77  |
|          |                                   |             |             | FP    | 0,00                 | 418,68   | 271,61  | 0,00                   | 427,94   | 279,77  |
| B2       | BRANCA                            | RURAL       | NA          | P     | 0,00                 | 1.486,18 | 431,37  | 0,00                   | 1.500,16 | 446,66  |
|          |                                   |             |             | INT   | 0,00                 | 952,43   | 271,61  | 0,00                   | 964,05   | 279,77  |
|          |                                   |             |             | FP    | 0,00                 | 418,68   | 271,61  | 0,00                   | 427,94   | 279,77  |
|          | PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL        | RURAL       | NA          | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
|          | SCEE - BRANCA                     | RURAL       | NA          | P     | 0,00                 | 1.486,18 | 431,37  | 0,00                   | 1.500,16 | 446,66  |
|          |                                   |             |             | INT   | 0,00                 | 952,43   | 271,61  | 0,00                   | 964,05   | 279,77  |
|          |                                   |             |             | FP    | 0,00                 | 418,68   | 271,61  | 0,00                   | 427,94   | 279,77  |
|          | SCEE - PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL | RURAL       | NA          | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
| B3       | BRANCA                            | NA          | NA          | P     | 0,00                 | 1.486,18 | 431,37  | 0,00                   | 1.500,16 | 446,66  |
|          |                                   |             |             | INT   | 0,00                 | 952,43   | 271,61  | 0,00                   | 964,05   | 279,77  |
|          |                                   |             |             | FP    | 0,00                 | 418,68   | 271,61  | 0,00                   | 427,94   | 279,77  |
|          | PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL        | NA          | NA          | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |
|          | SCEE - BRANCA                     | NA          | NA          | P     | 0,00                 | 1.486,18 | 431,37  | 0,00                   | 1.500,16 | 446,66  |
|          |                                   |             |             | INT   | 0,00                 | 952,43   | 271,61  | 0,00                   | 964,05   | 279,77  |
|          |                                   |             |             | FP    | 0,00                 | 418,68   | 271,61  | 0,00                   | 427,94   | 279,77  |
|          | SCEE - PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL | NA          | NA          | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 568,80   | 284,93  | 0,00                   | 578,72   | 293,67  |
|          |                                   |             |             | NA    | 0,00                 | 494,49   | 281,76  | 0,00                   | 499,80   | 290,46  |

Fonte: ANEEL (<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233292ti.pdf>)

Gráfico 8 - Comparativo dos custos de energia do ACR GRUPO B3 e da PPP

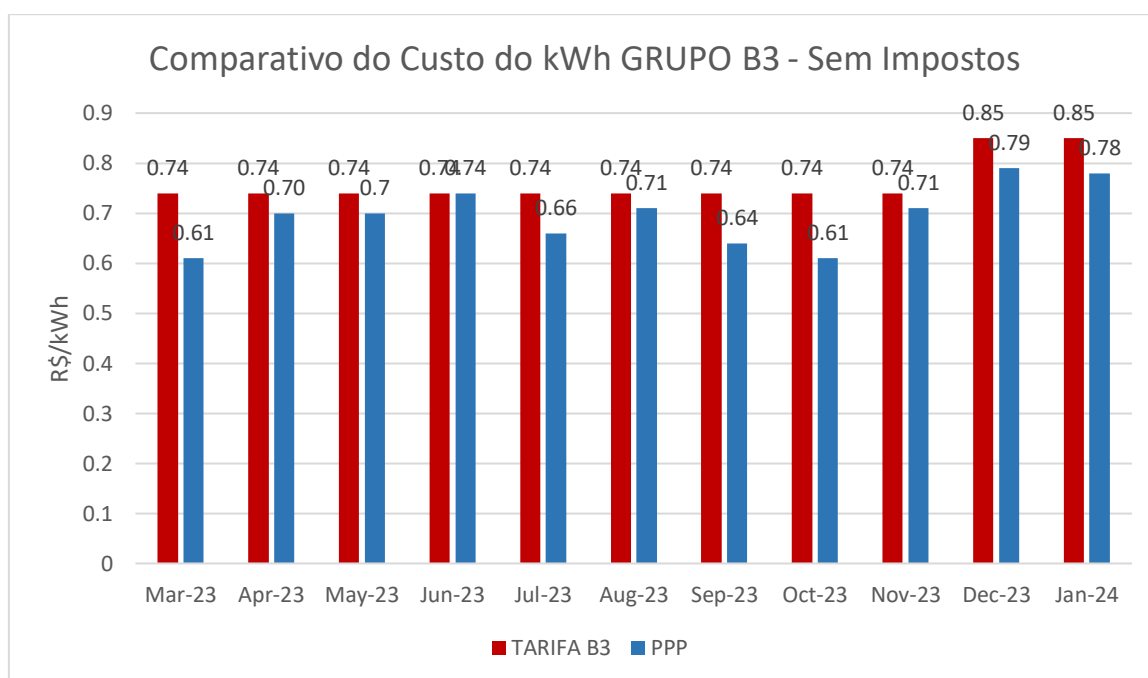

Fonte: Elaboração própria

Os dados referentes ao custo de energia serão monitorados no decorrer de todo o contrato de verificação, com o intuito de apresentar aos parceiros envolvidos no projeto o valor da economia gerada pelo projeto.


A partir de janeiro de 2024 observa-se uma diferença dos custos do kWh, isso ocorre devido ao reajuste tarifário da ANEEL por meio da RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA N 3.292, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023, cujo as tarifas foram reajustadas com uma média de 14,70%, conforme artigo segundo da resolução. Este aumento tarifário está em vigor no período de 02 de dezembro de 2023 a 01 de dezembro de 2024, logo valores presentes nos Gráficos 7 e 8 deste relatório foram atualizados.

O valor da contraprestação máxima paga pelo Poder Concedente durante o ano de 2023 foi de R\$ 460.586,71, em que foi atualizado para R\$ 484.858,53, representando um aumento de aproximadamente 5% do valor.

Assim, temos a principal vantajosidade financeira atuando no desempenho do projeto, visto que o contrato de PPP é reajustado pelo índice IPCA, enquanto a tarifa de energia é reajustada pela soma do IPCA com outros fatores externos, como a variação dos tributos, encargos setoriais e o clima, visto que a base da matriz elétrica brasileira é de fonte hídrica.

Para o ano de 2024 o comparativo do valor dos reajustes segue no gráfico abaixo.

Gráfico 9 - Comparativo do valor do reajuste anual.

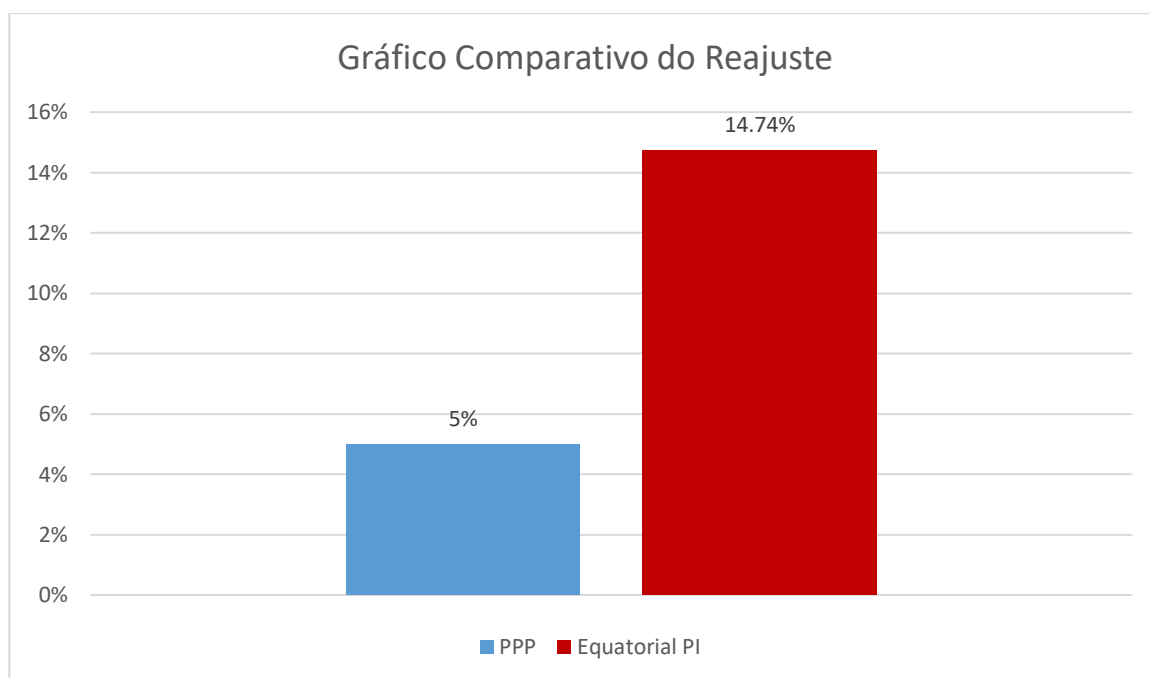

Fonte: Elaboração própria

## **10. INDICADORES DE DESEMPENHO**

Com o objetivo de garantir a excelência do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) para construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração de energia fotovoltaica, o monitoramento contratual será baseado em procedimentos constantes de verificação que avaliarão o desempenho da Concessionária de forma clara e objetiva. Os indicadores de desempenho serão focados nos resultados do serviço, estabelecendo níveis satisfatórios de desempenho definidos previamente pelo Estado, sem especificar como a Concessionária deve cumprir tais níveis, permitindo-lhe estabelecer os meios mais eficientes para atingir os resultados desejados.

O modelo de avaliação inserido neste documento conta com a descrição completa de cada indicador e a metodologia de medição destes indicadores de acordo com o período do projeto. Cada indicador será medido periodicamente, conforme descrito, conforme os critérios de desempenho definidos no ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC.

Adicionalmente, o montante da remuneração mensal que o Estado deve pagar à concessionária está vinculado aos indicadores pré-determinados estipulados no Edital e mencionados aqui. Esses indicadores serão acompanhados pelo Verificador Independente:

### **INDICADORES DE OBRA**

- Índice de Execução da Obra;
- Custo da Obra.

### **INDICADORES DE OPERAÇÃO**

- Produção de Energia por usina;
- Eficiência da Usina;
- Rendimento dos Inversores;

### **INDICADORES DE MANUTENÇÃO**

- Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos;



- Número de limpeza parcial e geral dos módulos;
- Número de atividades preventivas realizadas;
- Número de atividades preditivas realizadas;
- Número de atividades corretivas realizadas;

## INDICADORES DE VISITAS EDUCACIONAIS

- Número de Visitas;
- Qualidade das Visitas.

## INDICADORES ECONÔMICOS

- Custo Operacional Anual;
- Faturamento anual

### 10.1. INDICADORES DE OBRA

#### 10.1.1. Índice de Execução de Obra

Este indicador compõe o item 4.1.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo medir o andamento da obra de construção das Usinas Fotovoltaicas em relação ao tempo de execução previsto e ao tempo real, para que seja possível prever o início de operação das Usinas.

**Fórmula de Cálculo:** [(Dias corridos até a data de medição): (Total de dias previstos para obra)] x 100.

**Unidade de Medida:** Porcentagem (%).

**Método de Aferição:** Para medir este indicador é necessário que o Planejamento da Obra tenha sido concluído. Iniciando no dia 1, com 0% de execução da obra; podendo ultrapassar a casa de 100%, tendo em vista que atrasos nos dias previstos não devem alterar a base do indicador (dias total de obra previstos no planejamento).

**Período de Aferição:** Trimestral, até o fim da obra.

**Parâmetro:** É ideal que a porcentagem de execução da obra em relação ao tempo esteja de acordo com as atividades que estavam previstas para serem executadas até aquela data.

A Concessionária RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA iniciou plenamente as obras no mês de junho de 2022, assim este indicador foi avaliado até o mês de dezembro de 2022.

Abaixo estão definidos os marcos construtivos apresentados no cronograma enviado pela Concessionária.

- Junho de 2022: Início da supressão vegetal
- Novembro de 2022: Comissionamento a frio

Será considerado o período entre 29 de junho de 2022 à 01 de novembro 2022 como o período para a implantação da usina, desde a supressão vegetal até a preparação das obras para o comissionamento a frio, que são de estrita responsabilidade da Concessionária, temos que:

- Dias Previstos = 125

*Tabela 13 - Avaliação do Índice de Execução de Obra*

| Data da Medição  | Dias Corridos | Dias Previstos | Valor  |
|------------------|---------------|----------------|--------|
| Setembro de 2022 | 91            | 125            | 72,8%  |
| Dezembro de 2022 | 173           | 125            | 138,4% |

Fonte: Elaboração própria

- A medição realizada em setembro contabilizou os 91 dias corridos.
- A medição realizada em dezembro foi encerrada na data de 19 de dezembro de 2022.

A Concessionária teve um atraso de 48 dias, em relação ao cronograma previsto. O motivo do atraso ocorreu devido a não finalização da obra de conexão de responsabilidade da Equatorial Piauí, que estava prevista para novembro de 2022.

Para controlar os custos envolvendo o contrato de EPC, o Concessionário optou por mobilizar a equipe de comissionamento para a data prevista do fim das obras de conexão da Equatorial Piauí, e na data de 19 de dezembro de 2022 foi concluída o comissionamento a frio.

Considerando que a usina foi conectada na data de 12 de fevereiro de 2023 e que toda a obra foi finalizada, é declarada o encerramento de avaliação deste indicador.

#### **10.1.2. Custo de Obra**

Este indicador compõe o item 4.1.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo medir o andamento da obra de construção das Usinas Fotovoltaicas em relação ao custo de execução previsto e ao custo real, para que seja possível administrar o payback do empreendimento.

**Fórmula de Cálculo:** [(Notas pagas até a data de medição) : (Custo total previsto no planejamento)] x100

**Unidade de Medida:** Porcentagem (%).

**Método de Aferição:** Para medir este indicador é necessário que o Planejamento da Obra tenha sido concluído. Iniciando no dia 1, com 0% de custos; podendo ultrapassar a casa de 100%, tendo em vista que gastos não previstos não devem alterar a base do indicador (custo total da obra previstos no planejamento).

**Período de Aferição:** Trimestral, até o fim da obra.

**Parâmetro:** É ideal que até o final da obra o custo não ultrapasse 100%.

Até a presente data, não foi enviado a este Verificador Independente a relação de notas pagas para a construção da usina.

## 10.2. INDICADORES DE OPERAÇÃO

### 10.2.1. Desempenho de Produção de Energia

Este indicador compõe o item 4.2.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo medir o desempenho individual das Usinas Fotovoltaicas. Será verificado se os valores em kWh/mês estão de acordo com o pré-definido no EVTEA do contrato de PPP. A verificação se tornará mais qualificada na medida em que se formar uma série histórica da geração de energia nos horários de verificação. A aferição será feita a partir da comparação da produção diária, mensal e anual.

**Fórmula de Cálculo:** Soma da energia elétrica produzida pela usina fotovoltaica durante o mês.

**Unidade de Medida:** Quilowatt-hora por mês (kWh/mês).

**Método de Aferição:** Relatório do medidor de energia da concessionária (ANEEL).

**Período de Aferição:** Mensal, desde o início da operação ao fim do contrato.

**Parâmetro:** O valor deve ser de acordo com o consumo de energia elétrica do ESTADO estipulado conforme o EVTEA.

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

O indicador de produção de energia elétrica é o principal método de aferição dos serviços contratados, em que a SPE deve medir a quantidade de energia injetada na rede, por meio de sistema próprio ou pelo relógio de medição da Equatorial Piauí, e o CMOG/Verificador Independente tem como obrigação atestar a todos os dados apresentados.

Importante ressaltar que toda energia injetada na rede pela usina será enviada para unidades consumidoras cadastradas na Lista de Rateio, conforme apresentado no item 7, e que toda energia será dividida seguindo a proporção pré-estabelecida. Os valores de energia excedentes no referido mês que não foram utilizados ficarão armazenados no banco de crédito do SCEE por um período de até 60 meses, conforme Lei nº 14.300/2022.

Na documentação de faturamento enviada pela SPE, foi mensurada uma geração de 617.252,40 kWh/mês entre o período de 1 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024. O valor de geração está abaixo da energia esperada que é de 650.000 kWh/mês. Assim, será retirado do Banco de Créditos o valor de 32.747,60 kWh.

*Tabela 14 - Resumo do faturamento*

| QUADRO – RESUMO FATURAMENTO                    |                                            |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Geração Contratada</b>                      | Contrato de PPP                            | 650.000 kWh    |
| <b>Geração Mensurada nos Inversores</b>        | Auditoria Verificador Independente         | 617.252,40 kWh |
| <b>Geração Mensurada pela Rio Poti Energia</b> | Medição de janeiro                         | 617.252,40 kWh |
| <b>Geração Mensurada pela Equatorial Piauí</b> | Medição de janeiro                         | -              |
| <b>Geração Faturada</b>                        | Retirado 32.747,60 kWh ao Banco de Crédito | 650.000,00 kWh |

Fonte: Elaboração própria

Por meio da análise desenvolvida neste relatório, é constatado que a concessionária Rio Poti Energia cumpriu parcialmente com este indicador, realizando uma entrega abaixo do previsto. Entretanto, nenhum índice de redução da contraprestação deve ser aplicado, já que o banco de créditos da usina encontra-se com superavit de energia.

#### 10.2.1. Eficiência da Usina Fotovoltaica

Este indicador compõe o item 4.2.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de produção de energia real comparada com o índice de radiação daquele horário.

**Fórmula de Cálculo:**  $[(\text{Produção real de energia}) : (\text{Produção esperada no horário verificado})] \times 100$

**Unidade de Medida:** Porcentagem (%)

**Método de Aferição:** Para medir este indicador é necessário saber a quantidade de energia produzida diariamente e comparar com a produção máxima esperada das placas considerando a irradiação verificada pelos medidores de irradiância. Deverá ser feita a comparação também com a produção de energia verificada no horário verificado em relação com o mesmo horário em data anterior.

**Período de Aferição:** Diário, desde o início da operação ao fim do contrato.

**Parâmetro:** É ideal que o resultado seja próximo de 100%.

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

| CÁLCULO                  |                             |                              |            |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Mês da apuração: JANEIRO |                             |                              |            |
| Dia                      | GERAÇÃO DE ENERGIA ESPERADA | GERAÇÃO DE ENERGIA PRODUZIDA | Eficiência |
| 1                        | 12.840 KWh                  | 13.740,58 KWh                | 107%       |
| 2                        | 18.499 KWh                  | 19.623,60 KWh                | 106%       |
| 3                        | 11.452 KWh                  | 13.700,56 KWh                | 120%       |
| 4                        | 18.614 KWh                  | 19.830,38 KWh                | 107%       |
| 5                        | 16.276 KWh                  | 16.779,21 KWh                | 103%       |
| 6                        | 21.909 KWh                  | 22.497,11 KWh                | 103%       |
| 7                        | 16.259 KWh                  | 16.930,67 KWh                | 104%       |
| 8                        | 19.292 KWh                  | 20.145,15 KWh                | 104%       |
| 9                        | 23.023 KWh                  | 22.422,48 KWh                | 97%        |
| 10                       | 20.416 KWh                  | 20.468,99 KWh                | 100%       |
| 11                       | 9.442 KWh                   | 11.857,26 KWh                | 126%       |
| 12                       | 10.131 KWh                  | 11.579,08 KWh                | 114%       |
| 13                       | 17.442 KWh                  | 17.858,65 KWh                | 102%       |
| 14                       | 18.601 KWh                  | 20.120,36 KWh                | 108%       |
| 15                       | 22.999 KWh                  | 23.311,59 KWh                | 101%       |
| 16                       | 13.832 KWh                  | 15.194,33 KWh                | 110%       |
| 17                       | 22.963 KWh                  | 23.799,02 KWh                | 104%       |
| 18                       | 27.242 KWh                  | 27.224,03 KWh                | 100%       |
| 19                       | 28.303 KWh                  | 28.251,89 KWh                | 100%       |
| 20                       | 23.668 KWh                  | 23.547,01 KWh                | 99%        |
| 21                       | 26.403 KWh                  | 25.519,22 KWh                | 97%        |
| 22                       | 16.169 KWh                  | 16.788,88 KWh                | 104%       |
| 23                       | 22.712 KWh                  | 23.400,54 KWh                | 103%       |
| 24                       | 16.645 KWh                  | 17.180,41 KWh                | 103%       |
| 25                       | 22.974 KWh                  | 23.393,91 KWh                | 102%       |
| 26                       | 19.731 KWh                  | 20.810,50 KWh                | 105%       |
| 27                       | 12.556 KWh                  | 14.453,16 KWh                | 115%       |
| 28                       | 21.143 KWh                  | 21.267,62 KWh                | 101%       |
| 29                       | 14.457 KWh                  | 16.204,02 KWh                | 112%       |
| 30                       | 24.210 KWh                  | 23.759,99 KWh                | 98%        |
| 31                       | 25.600,31 KWh               | 25.592,20 KWh                | 100%       |

Os dados de GERAÇÃO DE ENERGIA ESPERADA são medidos pelos sistemas meteorológicos presentes na usina, os dados de GERAÇÃO DE ENERGIA PRODUZIDA são referentes a energia real gerada. Na tabela de dados apresentado pela SPE consta os valores medidos dia a dia, com uma **eficiência média de aproximadamente 105,02%**, assim, considerando que as condições climáticas sofrem variações em relação ao que foi previsto, é constatado que a eficiência apresentada pela planta fotovoltaica está em conformidade.

#### 10.2.1. Rendimento dos Inversores

Este indicador compõe o item 4.2.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a capacidade de funcionamento do equipamento.

**Fórmula de Cálculo:**  $[(Corrente\ contínua):(Corrente\ alternada)] \times 100$

**Unidade de Medida:** Porcentagem (%)

**Método de Aferição:** Dados fornecidos pelo inversor.

**Período de Aferição:** Diário, desde o início da operação ao fim do contrato.

**Parâmetro:** Deve estar de acordo com o dado de fabricação do inversor.

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

A fórmula de apresentação deste indicador está incorreta, pois a maneira correta de medir a eficiência de geração da usina é avaliando a relação entre Potência de Entrada (CC) com a Potência de Saída (CA). No item 3 do Relatório de Faturamento da SPE a tabela foi construída considerando as potências de saída e entrada, atestando uma eficiência de 98,3%, valor auditado por meio dos dados apresentados pelo inversor, e em conformidade.

*Tabela 15 - Rendimento dos inversores apurados em Janeiro de 2024.*

| CÁLCULO                  |                       |                     |            |  |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--|
| Mês da apuração: JANEIRO |                       |                     |            |  |
| Dia                      | POTÊNCIA ENTRADA (CC) | POTÊNCIA SAÍDA (CA) | Rendimento |  |
| 1                        | 1.667,10 KW           | 1.639,32 KW         | 98,3%      |  |
| 2                        | 1.900,05 KW           | 1.870,35 KW         | 98,4%      |  |
| 3                        | 1.799,68 KW           | 1.771,47 KW         | 98,4%      |  |
| 4                        | 2.892,45 KW           | 2.841,47 KW         | 98,2%      |  |
| 5                        | 2.467,28 KW           | 2.428,51 KW         | 98,4%      |  |
| 6                        | 2.057,10 KW           | 2.021,21 KW         | 98,3%      |  |
| 7                        | 2.861,40 KW           | 2.812,12 KW         | 98,3%      |  |
| 8                        | 2.256,47 KW           | 2.219,78 KW         | 98,4%      |  |
| 9                        | 2.733,49 KW           | 2.685,52 KW         | 98,2%      |  |
| 10                       | 2.009,49 KW           | 1.974,37 KW         | 98,3%      |  |
| 11                       | 1.211,37 KW           | 1.193,58 KW         | 98,5%      |  |
| 12                       | 1.453,82 KW           | 1.433,54 KW         | 98,6%      |  |
| 13                       | 1.771,74 KW           | 1.742,76 KW         | 98,4%      |  |
| 14                       | 2.911,05 KW           | 2.863,91 KW         | 98,4%      |  |
| 15                       | 2.445,48 KW           | 2.404,24 KW         | 98,3%      |  |
| 16                       | 2.906,66 KW           | 2.854,80 KW         | 98,2%      |  |
| 17                       | 1.893,68 KW           | 1.863,84 KW         | 98,4%      |  |
| 18                       | 2.860,88 KW           | 2.809,99 KW         | 98,2%      |  |
| 19                       | 2.876,90 KW           | 2.822,77 KW         | 98,1%      |  |
| 20                       | 2.866,71 KW           | 2.814,30 KW         | 98,2%      |  |
| 21                       | 2.876,63 KW           | 2.828,31 KW         | 98,3%      |  |
| 22                       | 2.245,37 KW           | 2.206,20 KW         | 98,3%      |  |
| 23                       | 1.048,43 KW           | 1.031,87 KW         | 98,4%      |  |
| 24                       | 2.678,26 KW           | 2.629,61 KW         | 98,2%      |  |
| 25                       | 2.875,64 KW           | 2.825,49 KW         | 98,3%      |  |
| 26                       | 1.938,27 KW           | 1.906,25 KW         | 98,3%      |  |
| 27                       | 1.624,44 KW           | 1.599,33 KW         | 98,5%      |  |
| 28                       | 1.950,03 KW           | 1.918,06 KW         | 98,4%      |  |
| 29                       | 2.130,03 KW           | 2.092,12 KW         | 98,2%      |  |
| 30                       | 2.741,87 KW           | 2.694,10 KW         | 98,3%      |  |
| 31                       | 2.873,71 KW           | 2.821,91 KW         | 98,2%      |  |

### 10.3. INDICADORES DE MANUTENÇÃO

#### 10.3.1. Número de Ocorrências de Equipamentos Defeituosos

Este indicador compõe o item 4.3.1 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a qualidade do produto adquirido.

**Fórmula de Cálculo:** *Soma do número de equipamentos defeituosos*

**Unidade de Medida:** Equipamentos

**Método de Aferição:** Soma de cada tipo de equipamento separados por marca.

**Período de Aferição:** Trimestral, do fim da obra ao encerramento do contrato.

**Parâmetro:** É ideal que o resultado seja próximo de 0 (zero).

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

No mês de janeiro não houve registro de ocorrências de equipamentos defeituosos.

| CÁLCULO                                        |       |             |            |
|------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| Trimestre da apuração: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO |       |             |            |
| #                                              | MARCA | EQUIPAMENTO | OCORRÊNCIA |
|                                                |       |             |            |

### 10.3.2. Número de limpeza parcial e geral dos módulos fotovoltaicos

Este indicador compõe o item 4.3.2 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a limpeza dos módulos fotovoltaicos.

Os dados apresentados pela SPE não estão claros, porém, o acúmulo de sujeira nos módulos impacta diretamente na capacidade de geração. Considerando que o valor de geração apresentado pela SPE está acima do esperado, entende-se que a planta fotovoltaica está operando plenamente, e que a Rio Poti Energia não deve ser penalizado ou ter a sua contraprestação afetada por este indicador.



| CÁLCULO                  |                                |                                                |        |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Mês da apuração: JANEIRO |                                |                                                |        |
| Subcampo                 | Quantidade de Limpeza Efetuada | Quantidade de Limpeza Efetuada no Ano Anterior | Desvio |
| 1                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 2                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 3                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 4                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 5                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 6                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 7                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 8                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 9                        | 0                              | 0                                              | 0      |
| 10                       | 0                              | 0                                              | 0      |
| 11                       | 0                              | 0                                              | 0      |
| 12                       | 0                              | 0                                              | 0      |
| 13                       | 0                              | 0                                              | 0      |
| 14                       | 0                              | 0                                              | 0      |

### 10.3.3. Número de atividades preventivas realizadas

Este indicador compõe o item 4.3.3 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica.

**Fórmula de Cálculo:** Soma do número de atividades preventivas no mês.

**Unidade de Medida:** Atividades preventivas.

**Método de Aferição:** Soma de todas as atividades preventivas realizadas na Usina Fotovoltaica.

**Período de Aferição:** Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato.

**Parâmetro:** Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento dos inversores para verificar se as atividades preventivas estão adequadas. Será utilizado como valores de parâmetros o número médio de atividades preventivas realizadas no mesmo mês do ano anterior, a contar do segundo ano de operação.

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

Durante o mês de janeiro a SPE realizou duas ações preventivas em algumas áreas da usina.

| CÁLCULO                  |                                     |                       |            |  |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--|
| Mês da apuração: JANEIRO |                                     |                       |            |  |
| #                        | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE              | EQUIPAMENTO           | DATA       |  |
| 1                        | Roçagem                             | Perímetro             | Janeiro    |  |
| 2                        | Limpeza Sensores Est. Solarimétrica | Estação Solarimétrica | 19.01.2024 |  |

#### 10.3.4. Número de atividades preditivas realizadas

Este indicador compõe o item 4.3.4 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica.

**Fórmula de Cálculo:** Soma do número de atividades preditivas no mês.

**Unidade de Medida:** Atividades preditivas.

**Método de Aferição:** Soma de todas as atividades preditivas realizadas na Usina Fotovoltaica.

**Período de Aferição:** Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato.

**Parâmetro:** Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento dos inversores para verificar se as atividades preditivas estão adequadas. Será utilizado como valores de parâmetros o número médio de atividades preditivas realizadas no mesmo mês do ano anterior, a contar do segundo ano de operação.

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

A SPE não relatou ação preditiva no mês de janeiro.

| CÁLCULO                  |                        |             |      |  |
|--------------------------|------------------------|-------------|------|--|
| Mês da apuração: JANEIRO |                        |             |      |  |
| #                        | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | EQUIPAMENTO | DATA |  |

#### 10.3.5. Número de atividades corretivas realizadas

Este indicador compõe o item 4.3.5 do ANEXO VII- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO- da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – SUPARC, em que tem como objetivo verificar a manutenção da Usina Fotovoltaica.

**Fórmula de Cálculo:** Soma do número de atividades corretivas no mês.

**Unidade de Medida:** Atividades corretivas.

**Método de Aferição:** Soma de todas as atividades corretivas realizadas na Usina Fotovoltaica.

**Período de Aferição:** Mensal, do fim da obra ao encerramento do contrato.

**Parâmetro:** Deve ser comparado com a eficiência da Usina Fotovoltaica e rendimento dos inversores para verificar se as atividades preditivas estão adequadas. Será utilizado como valores de parâmetros o número médio de atividades preditivas realizadas no mesmo mês do ano anterior, a contar do segundo ano de operação.

**Responsável:** Concessionária

**Ente Fiscalizador:** CMOG/Verificador Independente

A SPE relatou uma ação corretiva no mês de janeiro.

| CÁLCULO                  |                                                      |             |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Mês da apuração: JANEIRO |                                                      |             |            |
| #                        | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE                               | EQUIPAMENTO | DATA       |
| 1                        | Reset do inversor devido alarme por corrente reversa | Inversor 4  | 11.01.2024 |

#### 10.4. INDICADORES EDUCACIONAIS

Ainda não há base de dados para apuração dos indicadores educacionais.

#### 10.5. INDICADORES ECONÔMICOS

Ainda não há base de dados para apuração dos indicadores econômicos.

### 11. PLATAFORMA DE GESTÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

Conforme o escopo estabelecido, é responsabilidade deste Verificador Independente desenvolver ou adquirir uma ferramenta para acompanhar os dados da Concessão. O sistema deve ser capaz de armazenar de forma segura todos os documentos relacionados à Concessão, incluindo correspondências e relatórios periódicos, levando em consideração o longo prazo da Concessão.

O sistema deve ter funcionalidades gerenciais, auxiliando no fluxo de comunicação e no controle de prazos das correspondências entre as partes contratantes. Deve ser de fácil manuseio, incentivando sua utilização e permitindo a comunicação dos documentos cadastrados e alterados para um grupo de usuários autorizados previamente.

Além do cadastro da documentação relacionada à avaliação e monitoramento do contrato, o sistema também deve contar com um dashboard que apresente informações sobre a geração da usina e todos os dados relevantes sobre as externalidades do projeto. A estrutura de informações da aplicação abrange os itens descritos na tabela abaixo.

*Tabela 16 - Estrutura do software de gestão de contrato*

| INPUT                              | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados de Geração da Usina          | Avaliar a capacidade de geração da usina de acordo com valor estipulado no contrato de concessão da PPP Energia Limpa do Piauí.<br>Dados Apresentados: <ul style="list-style-type: none"><li>• Geração Mensal</li><li>• Geração Anual</li></ul> |
| Dados de Eficiência dos Inversores | Avaliar a eficiência de funcionamento dos inversores.<br>Dados Apresentados: <ul style="list-style-type: none"><li>• Eficiência dos arranjos dos inversores</li></ul>                                                                           |
| Externalidades Ambientais          | Apresentar informações referentes ao impacto ambiental gerado pelo projeto.<br>Dados Apresentados: <ul style="list-style-type: none"><li>• Emissão de CO2 evitadas</li></ul>                                                                    |
| Desempenho Financeiro do Projeto   | Apresentar os valores do custo de energia com o projeto, bem como, um comparativo                                                                                                                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>entre a contratação por PPP com o método convencional pelo ACR.</p> <p>Dados Apresentados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Custo do kWh/mês com a PPP, na unidade de R\$/kWh</li> <li>• Custo do kWh/mês com a contratação convencional, na unidade de R\$/kWh</li> <li>• Evolução do custo de energia no estado do Piauí</li> <li>• Evolução do índice IPCA no Brasil</li> </ul> |
| Arquivo de Relatórios e Comunicação | <p>Funcionalidade de armazenamento das documentações produzidas.</p> <p>Dados Apresentados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Histórico de comunicação</li> <li>• Relatórios Mensais</li> <li>• Relatórios Trimestrais</li> <li>• Pareceres Produzidos</li> </ul>                                                                                                                      |

Fonte: Elaboração própria

Todos os dados gerados pela usina serão produzidos pela plataforma do inversor, e todas as informações serão repassadas a este Verificador Independente pela Concessionária, por meio de um arquivo no formato CSV. A planilha apresentada será inserida mensalmente no *software* desenvolvido, que realizará todos os cálculos automaticamente e entregará as informações de maneira concisa e clara. Dentro do banco de dados do *software* será inserido mensalmente todos os relatórios e documentos produzidos, com a finalidade de organizar toda a informação que envolve o projeto.

A plataforma escolhida para o desenvolvimento da aplicação é o Power BI, que é um sistema de análise de dados e negócios da Microsoft que permite coletar, transformar e visualizar dados de diferentes fontes em um único painel. Com o Power BI, os usuários podem criar relatórios e painéis interativos e compartilhá-los com outras pessoas em suas organizações.


O Power BI é compatível com uma ampla gama de fontes de dados, incluindo Excel, SharePoint, Google Analytics, Salesforce, SQL, Azure e muitos outros. Ele pode ser acessado

por meio de um navegador web ou por meio de aplicativos móveis, tornando-o acessível em qualquer lugar e a qualquer momento.

O motivo da escolha da plataforma Power BI é pelo fato de pertencer a empresa Microsoft Corporation, que é consolidada no mercado de tecnologia como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Microsoft tem um forte compromisso com a segurança dos dados de seus usuários e investe continuamente em medidas de segurança robustas para proteger a privacidade e integridade das informações.

A figura abaixo é o layout preliminar da aplicação desenvolvida. O projeto está na fase de validação do banco de dados.

Figura 7 - Software de monitoramento e gestão de contrato

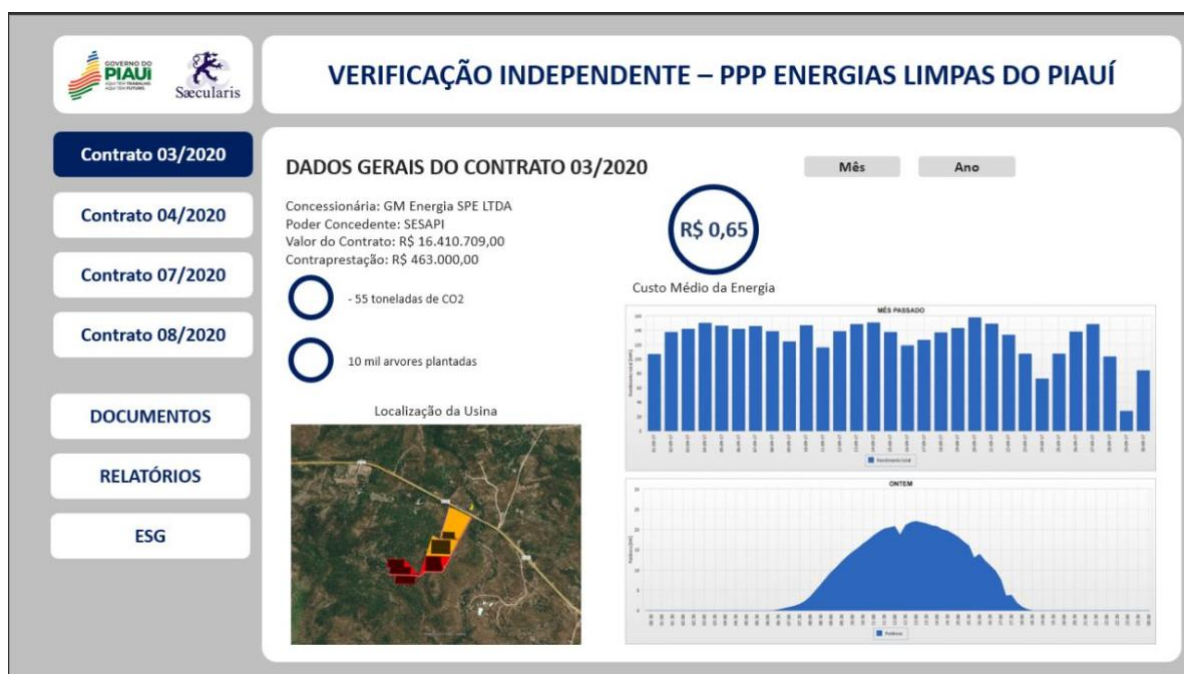

Fonte: Elaboração própria

O cronograma de desenvolvimento do *software* segue o processo de operação da usina, visto que é necessário ter acesso ao volume de dados a serem entregues pela Concessionária, bem como a qualidade e formato dos arquivos. Abaixo está descrito o cronograma de desenvolvimento contendo os principais marcos, e as entregas podem ter antecipações ou atrasos de acordo com o prazo e formato dos dados entregues, visto que é necessário a realização de testes prévios para validar o funcionamento pleno da ferramenta.

Tabela 17 - Cronograma de desenvolvimento do software

| DESCRIÇÃO                                              | PRAZO            | SITUAÇÃO     |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Definição dos formatos de dados                        | Novembro de 2022 | CONCLUÍDO    |
| Escolha da plataforma                                  | Dezembro de 2022 | CONCLUÍDO    |
| Definição dos dados apresentados e formato dos painéis | Janeiro de 2023  | CONCLUÍDO    |
| Layout do software                                     | Maior de 2023    | CONCLUÍDO    |
| Desenvolvimento do banco de dados                      | Março de 2024    | EM ANDAMENTO |
| Testes iniciais do sistema e correção de bugs          | Abril de 2024    | EM ANDAMENTO |
| Entrega do sistema                                     | Maior de 2024    | A REALIZAR   |

Fonte: Elaboração própria

## 12. CONTROLE DE PENDÊNCIAS

Este tópico tem como objetivo apresentar de maneira clara obrigações em aberto ou pendentes de resposta pelos agentes contratuais (Poder Público e Parceiro Privado), de acordo com o conhecimento adquirido até o momento do Verificador Independente. Essas questões serão tratadas por meio de comunicações oficiais ou verificadas nas obrigações contratuais e regulamentações aplicáveis.

É recomendado que, no que se refere a questões gerais comuns à Concessão, as comunicações sejam enviadas a todos os agentes contratuais, visando garantir o acompanhamento adequado da Concessão e permitindo a atualização do Controle de Pendências.

Tabela 18 - Quadro de pendências contratuais dos agentes envolvidos

| ITEM | PENDÊNCIAS | DOCUMENTO | DATA | STATUS |
|------|------------|-----------|------|--------|
|------|------------|-----------|------|--------|

|   |                            |                                                     |            |                     |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | Entrega do <i>as built</i> | ANEXO VI DO<br>CONTRATO –<br>CADERNO DE<br>ENCARGOS | 13/02/2023 | NÃO<br>IDENTIFICADO |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|

Fonte: Elaboração própria

Referente ao item 1 da tabela 9, até a presente data de elaboração do relatório, não foi identificado a entrega do *as built* ao Poder Concedente, conforme item 4.1.6. do ANEXO VI DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS.

“4.1.6. Apresentar, ao final da obra, o “*as built*” completo, em meio magnético e por meio de cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da CONCESSIONÁRIA;”

É recomendável que a Concessionária elabore esta documentação, visto que trata-se de um marco temporal importante para o contrato.



### 13. SOLICITAÇÕES E COMUNICAÇÃO

No mês de janeiro foram expedidas as comunicações pelo Verificador Independente citadas abaixo:

Tabela 19 - Controle de comunicação e solicitações

| DOCUMENTO                                                                            | DATA       | REMETENTE  | DESTINATÁRIO             | ASSUNTO                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Re: Ofício N°:<br/>65/2024/SEAD-<br/>PI/GAB/SUPARC/CMOG</b>                       | 16/01/2024 | SAECULARIS | GIORGIO SANTOS<br>(GNPW) | Envio de ofício e relatório de ocorrências na UFV.                                                                   |
| <b>Aceite Relatório VEI -<br/>Janeiro 2024 - Contratos<br/>Ns° 07/2020 e 08/2020</b> | 18/01/2024 | SAECULARIS | CMOG/SUPARC/SEAD-<br>PI  | Ofício de aceite dos relatórios das usinas 07 e 08 da Rio Poti Energia, referente ao mês de Janeiro de 2024.         |
| <b>RELATÓRIO FISCAL<br/>DO CONTRATO -<br/>FATURA JANEIRO 2024</b>                    | 18/01/2024 | SAECULARIS | CMOG/SUPARC/SEAD-<br>PI  | Relatório do Fiscal do Contrato referente à fatura de janeiro de 2024 para ciência e manifestação da Concessionária. |
| <b>Ofício N°:<br/>293/2024/SEAD-<br/>PI/GAB/SUPARC/CMOG</b>                          | 05/02/2024 | SAECULARIS | CMOG/SUPARC/SEAD-<br>PI  | Ofício referente à apuração do saldo de energia acumulado junto à Equatorial do Contrato.                            |
| <b>Faturamento UFV Campo<br/>Maior - Janeiro/2024</b>                                | 05/02/2024 | SAECULARIS | GIORGIO SANTOS<br>(GNPW) | Relatório de faturamento do contrato, protocolado no SEI no mesmo dia do envio.                                      |
| <b>Ofício Circular -<br/>obrigações contratuais -<br/>Contrato 07/2020 SEAD</b>      | 07/02/2024 | SAECULARIS | GIORGIO SANTOS<br>(GNPW) | Ofício em resposta às informações                                                                                    |

|                                                                       |            |            |                          |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |            |            |                          | solicitadas,<br>relativo ao<br>contrato                          |
| <b>Informações de<br/>Faturamento UFV Campo<br/>Maior e UFV Altos</b> | 07/02/2024 | SAECULARIS | GIORGIO SANTOS<br>(GNPW) | Informações de<br>faturamento<br>relativas ao mês de<br>janeiro. |

Fonte: Elaboração própria

## REFERÊNCIAS

BRESSANE, L. A. *Energia Solar no Brasil: Um Estudo sobre o Potencial e as Barreiras do Desenvolvimento da Geração Distribuída*. 1ª edição. Curitiba: Appris, 2020.

ANEEL. *Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012. Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 abr. 2012. Seção 1, p. 127.*

PMI. *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)*. 6ª edição. São Paulo: Project Management Institute, 2017.

## CONCLUSÃO

Com base nas ações realizadas pela SPE no mês de **janeiro de 2024**, e considerando os documentos acostados aos autos e a avaliação realizada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, conclui-se que a SPE tem atendido de forma regular e satisfatória as regras da concessão.

A RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA realizou todas as suas obrigações construtivas, o comissionamento e conexão da rede de distribuição elétrica da Equatorial Piauí. Após o processo de comissionamento, a usina iniciou a geração de energia elétrica na rede de distribuição, e o faturamento apresentado está em conformidade

Teresina (PI), 16 de janeiro de 2024.



**Jorge Ivan Teles de Sousa**

*Gerente Geral do Projeto*

*Sócio da Saecularis*

**OFÍCIO Nº 07/2024/VI\_MINIUSINAS**

Teresina, 19 de fevereiro de 2024

**Ilmo. Sr. Emmanuel Fernando de Assunção Saraiva**

Coordenador do Comitê de Monitoramento e Gestão de Contratos - CMOG

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC

**C/C Ilmo. Sr. Elizeu Campos**

Representante Legal: RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA

**Assunto:** Envio do relatório mensal referente ao contrato nº 07/2020.

Excelentíssimo Senhor,

Na condição de Verificador Independente do Contrato de Parceria Público-Privada nº 07/2020, vem, em atenção à cláusula VI do Contrato de Empresa Especializada para atuar como Verificador Independente, apresentar o Relatório Mensal de Verificação SAECULARIS\_C07\_M01\_A24, referente ao mês de janeiro de 2024.

Destacamos nossa total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários.



**Jorge Ivan Teles de Sousa**

*Gerente Geral do Projeto*

*Saecularis*
